Hướng dẫn sử dụng Bộ công cụ dự án

Chọn đúng vai trò của bạn để xem phần hướng dẫn dành riêng cho mình. Mỗi phần có **ảnh màn hình thật**, các **số đỏ** ①②③ trên ảnh tương ứng với danh sách giải thích bên dưới. Bấm vào ảnh để phóng to. Dữ liệu trong ảnh là **dữ liệu mẫu** (tên người, dự án đều là giả định).

👷 Fitter / Nhân viên

- Chấm công hằng ngày trên điện thoại
- Ghi báo cáo thi công
- Nộp bảng công cuối kỳ (trước ngày 12)

Xem hướng dẫn Fitter →

🦺 Giám sát (Site Sup)

- Duyệt / trả lại bảng công của fitter
- Lập hồ sơ chất lượng, biên bản
- Xem lịch trình dự án của mình

Xem hướng dẫn Giám sát →

📋 Quản lý dự án

- Duyệt bảng công cấp 2
- Điều phối fitter (kéo thả)
- So kế hoạch với chấm công thực tế

Xem hướng dẫn Quản lý →

🛡️ Quản trị viên

- Nhân viên, dự án, tài khoản
- Nạp bảng công Excel hằng tháng
- Phân quyền, gắn email


Xem hướng dẫn Quản trị →


1. Bắt đầu

Dành cho mọi người dùng.

1.1. Đăng nhập

Mở trình duyệt (Chrome, Safari, Edge…) và vào địa chỉ **https://nihan-ts.pages.dev**. Không cần mật khẩu: hệ thống gửi **mã đăng nhập 6 số vào email** của bạn.

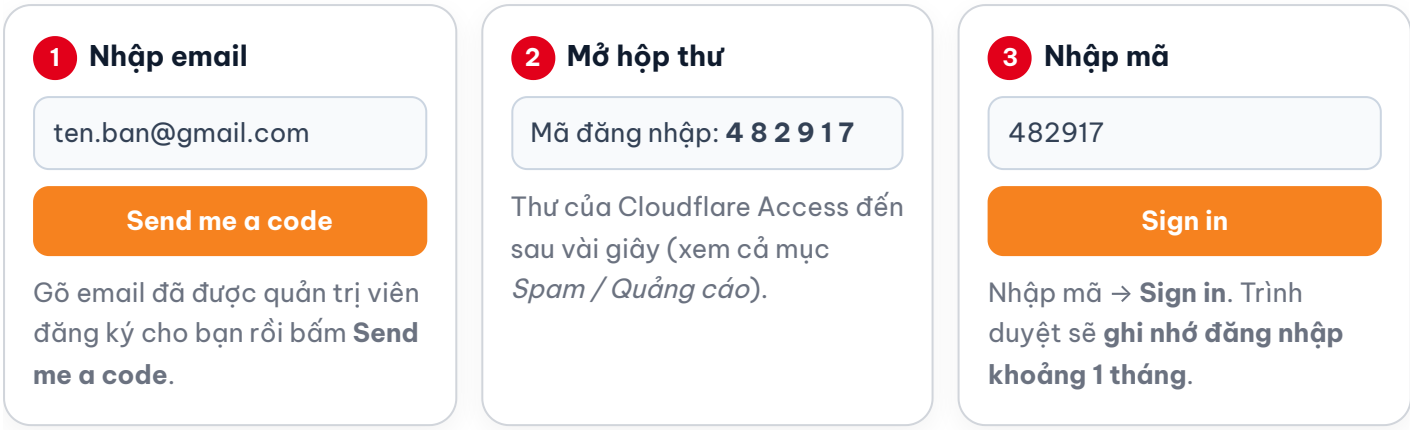

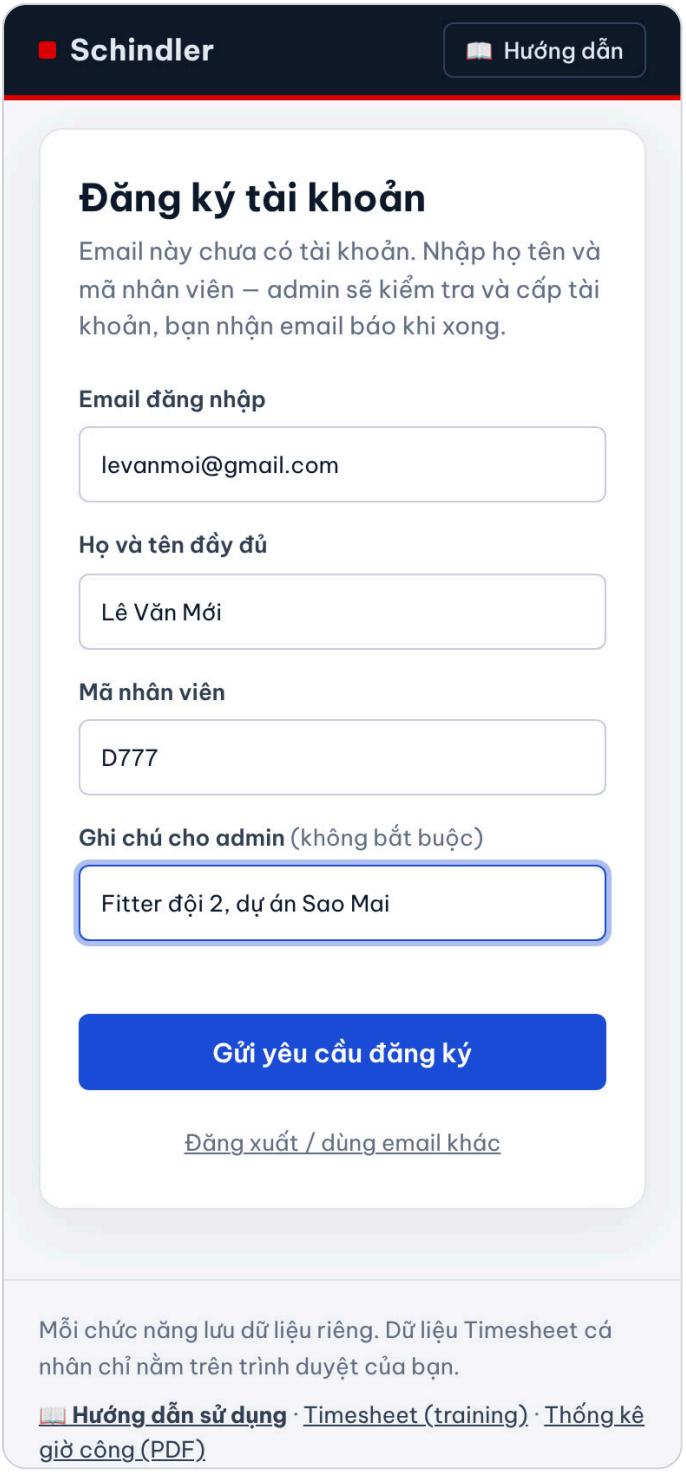

Lần đầu: đăng ký tài khoản


Lần đầu đăng nhập bằng email chưa có tài khoản, app chuyển sang bước **Đăng ký tài khoản**:

1. Nhập **họ và tên đầy đủ** và **mã nhân viên** (theo dữ liệu nhân sự). Ghi chú cho admin nếu cần (đội, dự án đang làm).
2. Bấm `Gửi yêu cầu đăng ký` — admin nhận email ngay. Trang hiện *"Đã gửi yêu cầu… đang chờ admin duyệt"*; ghi sai thì bấm `Sửa thông tin đã gửi`.
3. Admin duyệt xong, bạn nhận email *"Tài khoản … đã được cấp"* → mở lại app (hoặc bấm *Admin đã duyệt? Bấm để vào lại*) là vào thẳng trang chủ. Nếu admin không duyệt, email và trang đăng ký ghi rõ lý do — sửa rồi gửi lại.

4 **Đăng xuất / dùng email khác** — nếu bạn lỡ nhập nhầm email.

ℹ️ Mỗi người **một email**. Có thể dùng Gmail cá nhân hoặc email công ty. Tài khoản bị khoá thì liên hệ quản trị viên.

1.2. Trang chủ

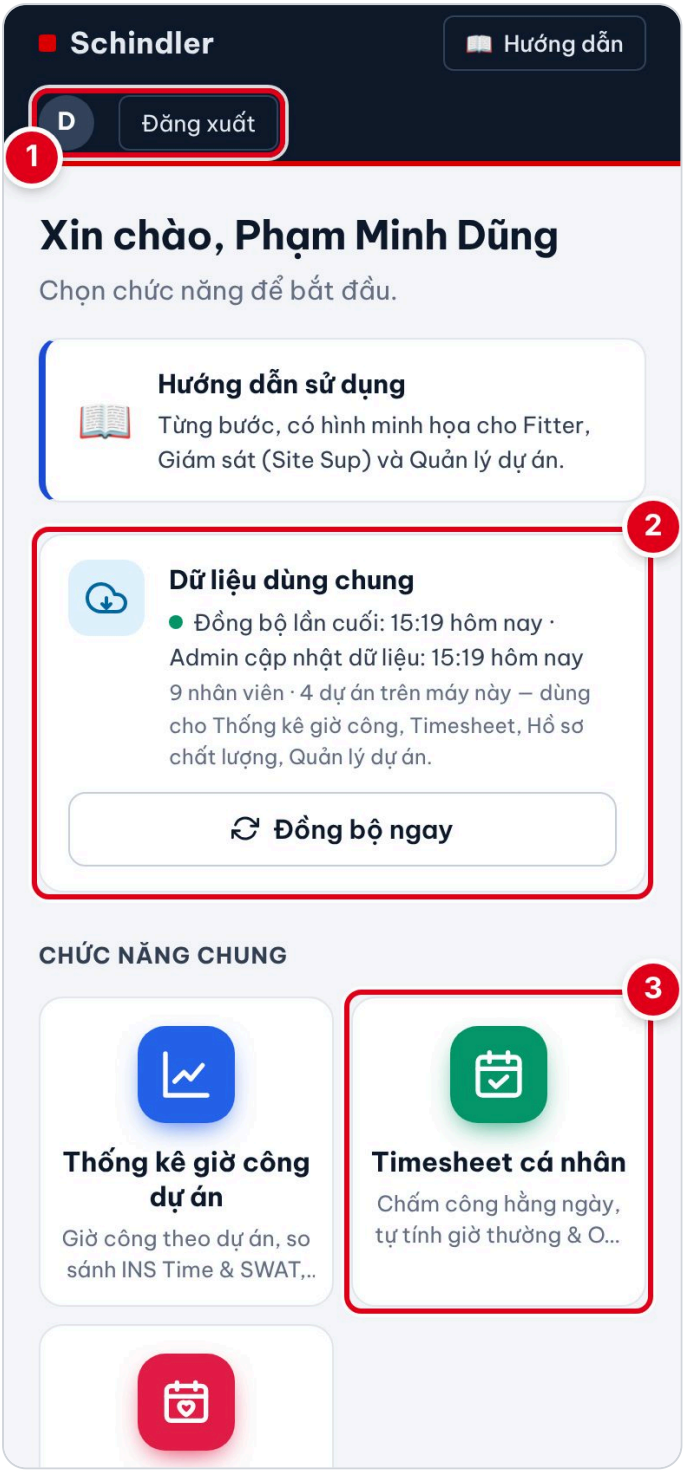

Trang chủ (điện thoại) — tài khoản Fitter


1. **Tài khoản** — chữ cái đầu tên bạn và nút `Đăng xuất`. Dùng máy chung thì nhớ đăng xuất.
2. **Dữ liệu dùng chung** — danh sách nhân viên và dự án được tải về máy để dùng cả khi mất mạng. Bấm `Đồng bộ ngay` nếu không thấy dự án mới.
3. **Các chức năng** — bấm vào thẻ để mở. Mỗi vai trò thấy những chức năng khác nhau; chức năng chưa được dùng hiện ở ô khoá 🔒.

Vai trò	Chức năng dùng được
Fitter / Nhân viên	Timesheet cá nhân, Thống kê giờ công
Giám sát (Site Sup)	+ Duyệt bảng công, Hồ sơ chất lượng, Quản lý dự án
Quản lý dự án	+ Duyệt bảng công (cấp 2), Quản lý dự án đầy đủ
Quản trị viên	Tất cả + mục **Quản trị**

Vai trò được xác định theo **chức danh** trong dữ liệu nhân sự. Thấy sai chức năng → báo quản trị viên.

> 💡 📖 Cần xem lại tài liệu này? Bấm nút **Hướng dẫn sử dụng** ở thanh trên cùng trang chủ, hoặc nút 📖 **Hướng dẫn** trên thanh đen của từng chức năng — mở thẳng phần dành cho chức năng đó.

1.3. Cài lên điện thoại & dùng khi mất sóng

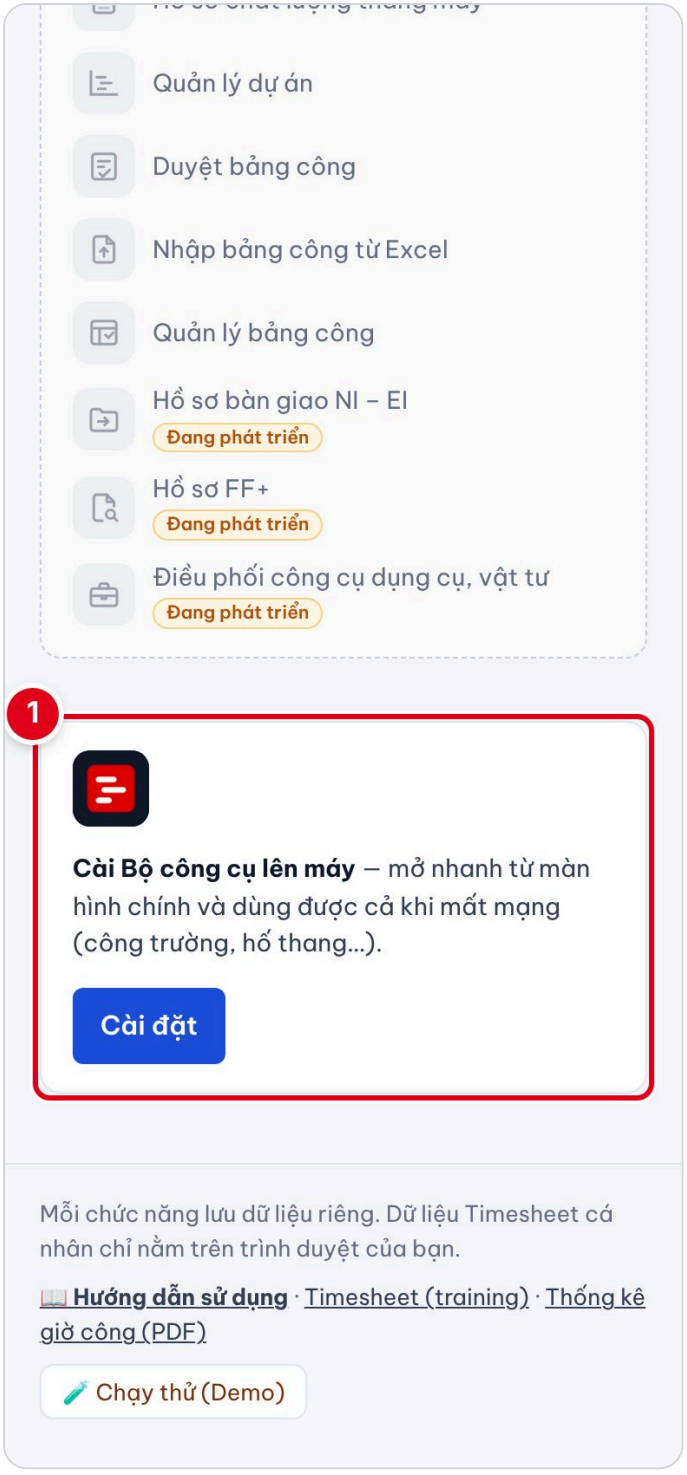

Thẻ “Cài Bộ công cụ lên máy” ở cuối trang chủ

1 Bấm `Cài đặt` để có biểu tượng trên màn hình chính, mở nhanh như một ứng dụng.

📱 Android (Chrome)

Bấm `Cài đặt` trên thẻ, hoặc menu ⋮ → **Cài đặt ứng dụng / Thêm vào màn hình chính**.


🍎 iPhone (Safari)

Bấm nút **Chia sẻ** (ô vuông có mũi tên lên) → **Thêm vào MH chính** → **Thêm**.


💡 **Mất sóng ở công trường vẫn chấm công được.** Dữ liệu lưu ngay trên điện thoại, có mạng lại thì **tự gửi lên máy chủ**. Thanh trạng thái sẽ báo "Mất mạng — dữ liệu an toàn trên máy".

1.4. Chạy thử (Demo) — tập dùng không sợ sai

Muốn thử bấm các nút mà không ảnh hưởng dữ liệu thật? Bấm 🧪 Chạy thử (Demo) ở **chân trang chủ** (dùng được cả khi email chưa được cấp quyền), chọn vai trò muốn thử. Mỗi vai trò là một nhân viên mẫu: **Fitter** — Phạm Minh Dũng, **Site Sup** — Trần Thị Bình, **Quản lý dự án** — Nguyễn Văn An.

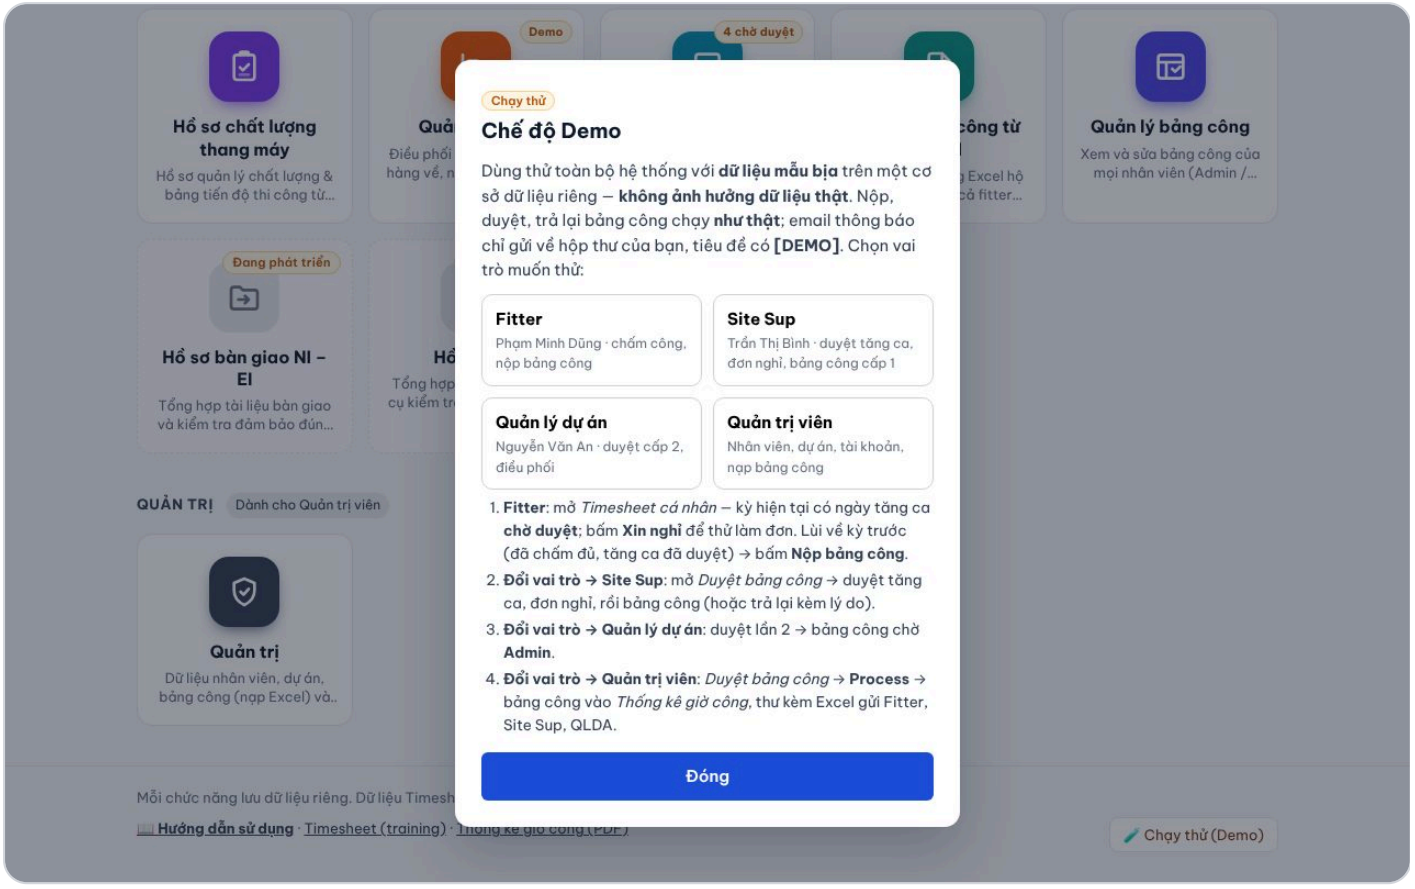

Chọn vai trò muốn thử

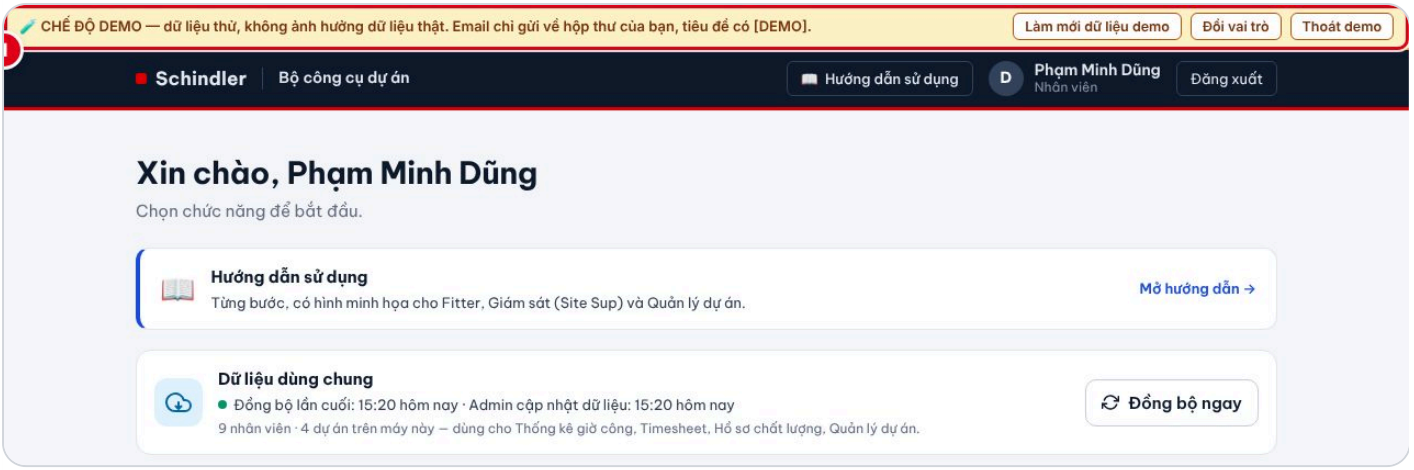

Đang ở chế độ demo: thanh vàng luôn hiện ở đầu trang

1. Thanh vàng **CHẾ ĐỘ DEMO**: dữ liệu mẫu riêng, **không ảnh hưởng dữ liệu thật**. Có nút `Làm mới dữ liệu demo`, `Đổi vai trò`, `Thoát demo`.

Demo chạy như thật — thử trọn một vòng bảng công:

1. Vai **Fitter**: mở *Timesheet cá nhân*, bấm `‹` về kỳ trước (đã chấm đủ) → `Nộp bảng công`.
2. `Đổi vai trò` → **Site Sup**: mở *Duyệt bảng công*, duyệt hoặc trả lại kèm lý do.
3. `Đổi vai trò` → **Quản lý dự án**: duyệt lần 2 → bảng công tự vào *Thống kê giờ công*.

Đổi vai trò **giữ nguyên dữ liệu** đã làm. Muốn làm lại từ đầu: `Làm mới dữ liệu demo`.

ℹ️ 📧 **Email trong demo vẫn gửi thật, nhưng chỉ về hộp thư của bạn** (email đang đăng nhập). Tiêu đề bắt đầu bằng **[DEMO]**, đầu thư có khung vàng **"THƯ DEMO"** ghi rõ trong hệ thống thật thư sẽ gửi tới ai. Thư tự soạn trong Timesheet (Gửi mail, Báo cáo ngày) cũng có **[DEMO]** ở tiêu đề.

⚠️ Nhớ bấm **Thoát demo** khi thử xong — chấm công thật phải làm ngoài chế độ demo.

👷 2. Fitter / Nhân viên — Timesheet cá nhân

Chấm công hằng ngày, ghi báo cáo thi công, nộp bảng công cuối kỳ.


ℹ️ 📘 Tài liệu training riêng, có **sơ đồ khối** từng bước, checklist và thẻ nhớ in được: **Hướng dẫn Timesheet cá nhân** (PDF) · 🎬 Video cho Fitter và Giám sát.

📌 **Ghi nhớ 3 điều:**

1. **Kỳ lương** tính từ **ngày 16 tháng trước đến ngày 15 tháng này** (ví dụ kỳ 11/2026 = 16/10 → 15/11).
2. Chấm công **mỗi ngày** (làm xong ca là chấm luôn, kèm vài dòng báo cáo thi công).
3. **Nộp bảng công trước ngày 12** của tháng kết thúc kỳ (kỳ 11/2026 → nộp trước 12/11). Các ngày 13–15 chấm trước theo kế hoạch rồi nộp.

2.1. Màn hình Timesheet

Từ trang chủ bấm thẻ **Timesheet cá nhân**.

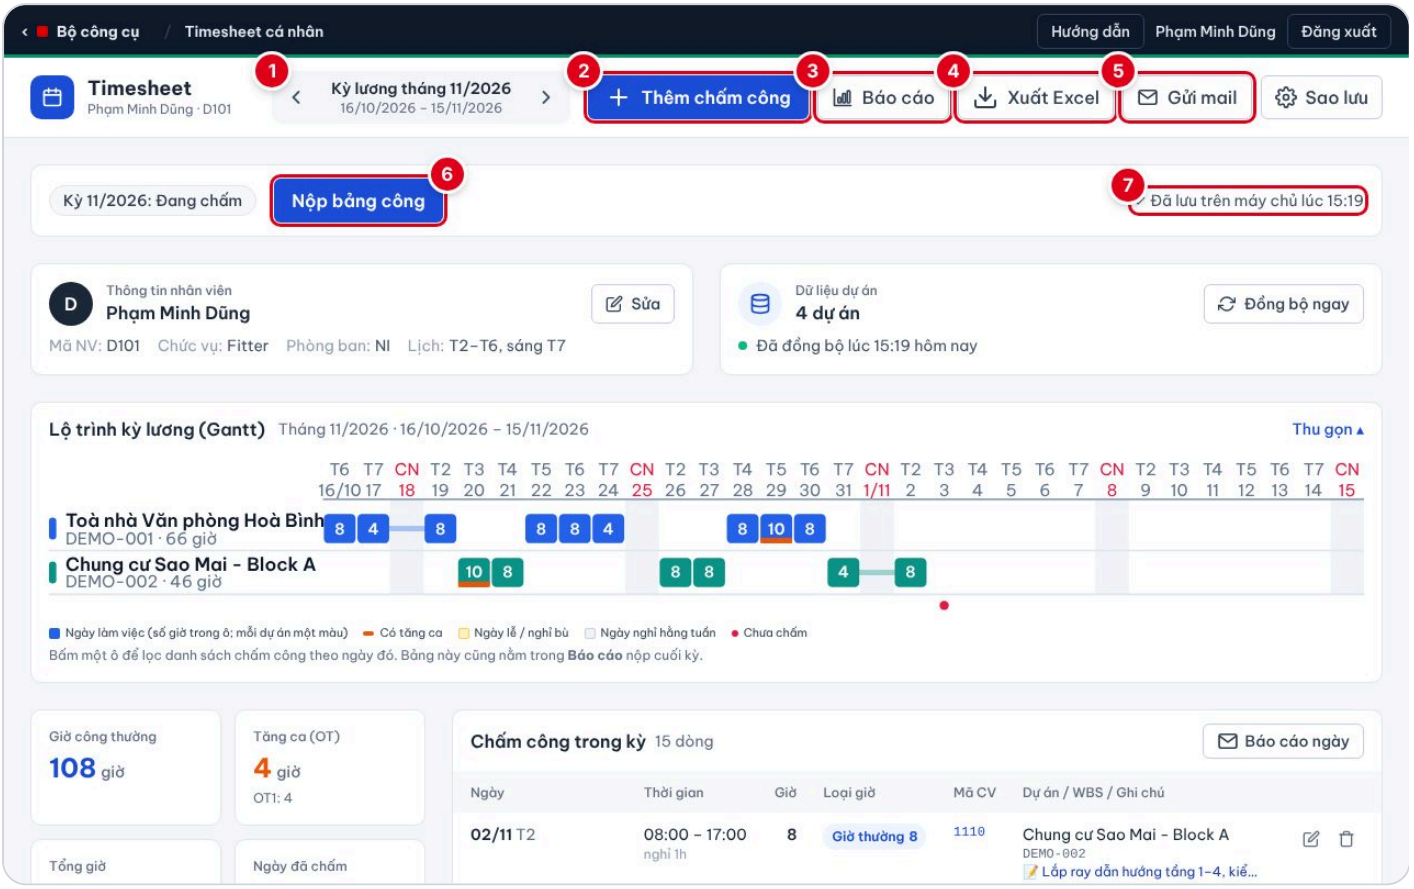


Timesheet cá nhân (máy tính)

1 **Kỳ lương** — bấm ‹ › để xem kỳ trước / kỳ sau.

2 **+ Thêm chấm công** — ghi một dòng chấm công mới (xem mục 2.2).

3. **Báo cáo** — bản tổng hợp cả kỳ (giờ thường, tăng ca, theo dự án, biểu đồ) để xem hoặc in.
4. **Xuất Excel** — tải file bảng công theo mẫu công ty.
5. **Gửi mail** — gửi bảng công (kèm file Excel) cho giám sát qua ứng dụng email của bạn.
6. Nộp bảng công — nộp cả kỳ để giám sát duyệt (mục 2.5).
7. **Trạng thái lưu** — "✓ Đã lưu trên máy chủ" là dữ liệu đã an toàn; "Chưa gửi" / "Mất mạng" là đang chờ mạng để gửi.

Phía dưới có: **Thông tin nhân viên** (tự lấy theo tài khoản), **Lộ trình kỳ lương (Gantt)** cho thấy mỗi ngày làm dự án nào, bao nhiêu giờ, và các ô thống kê **Giờ công thường / Tăng ca / Tổng giờ / Ngày đã chấm**.

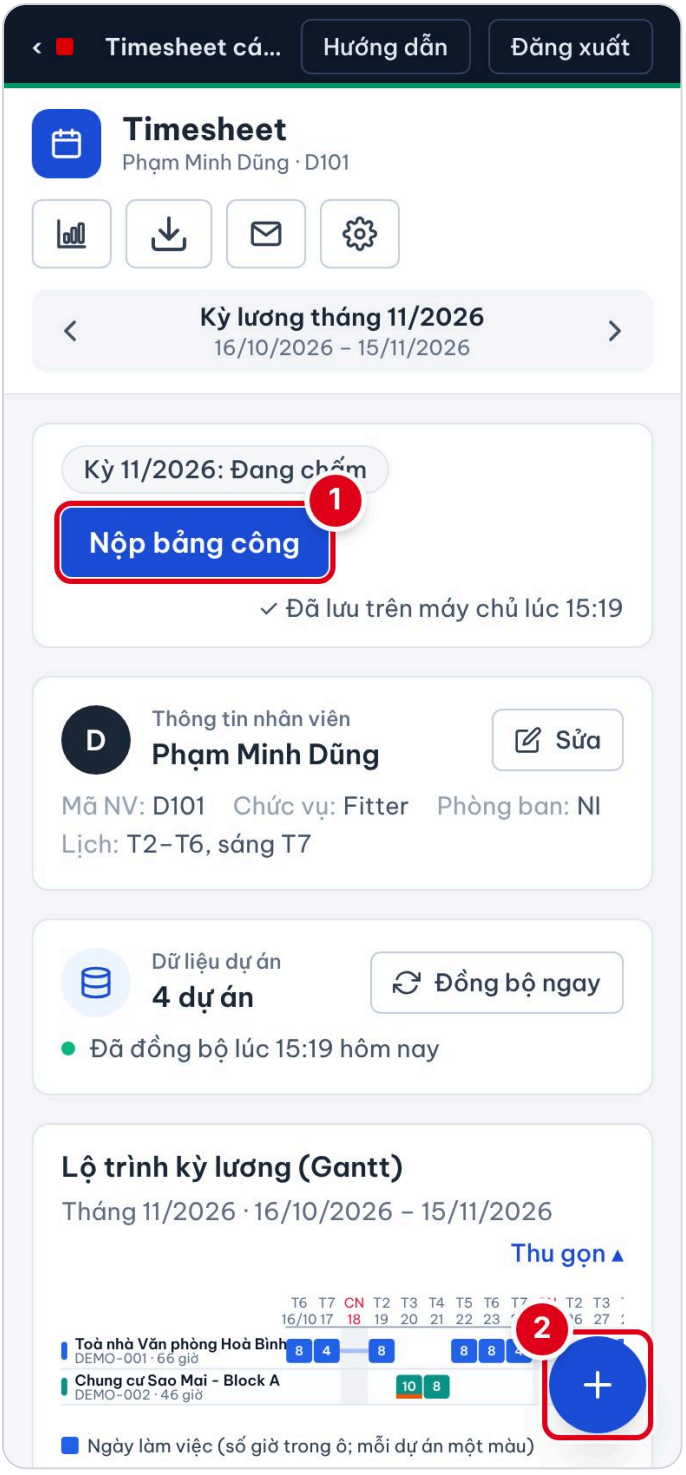


Trên điện thoại

Trên điện thoại


1. **Nộp bảng công** nằm ngay đầu trang.
2. Nút tròn + ở góc dưới luôn hiện khi cuộn — bấm để thêm chấm công.

Các nút Báo cáo, Xuất Excel, Gửi mail, Cài đặt là 4 biểu tượng nhỏ dưới tên bạn.

2.2. Thêm chấm công (mỗi ngày)

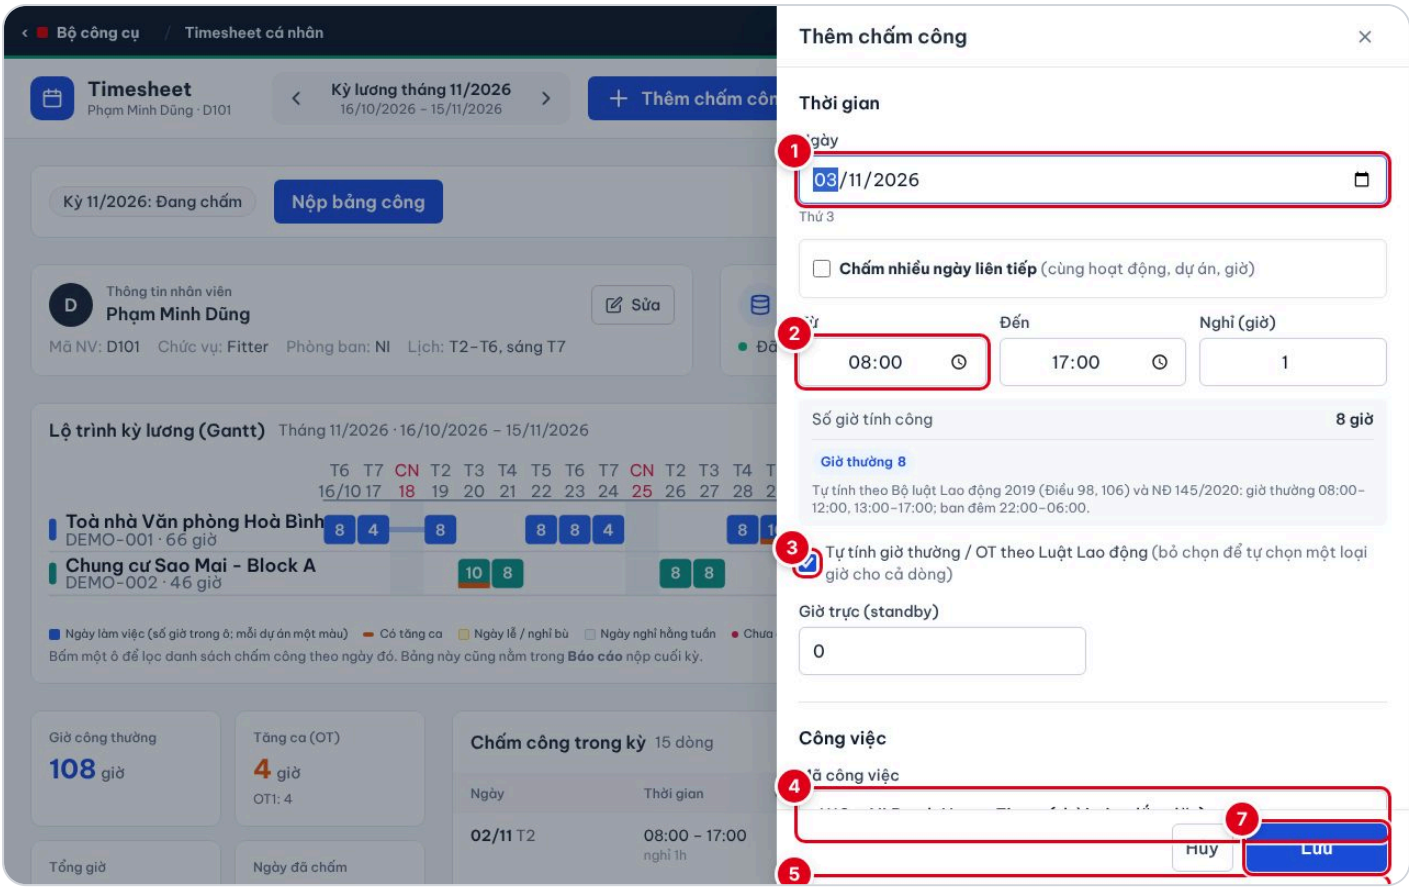

Phần trên: thời gian

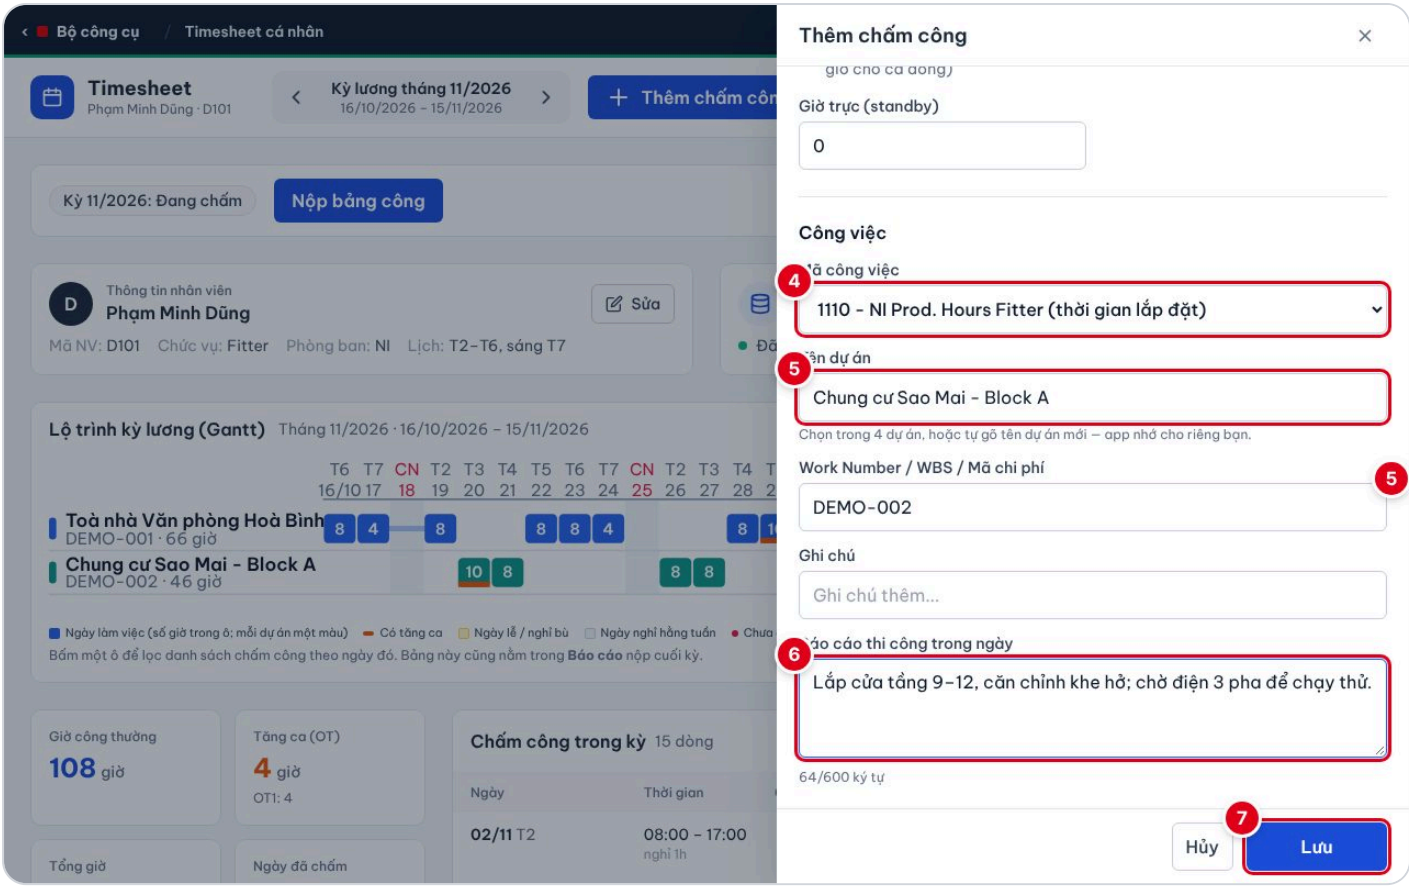


Phần dưới: công việc, báo cáo

1. **Ngày** — mặc định là hôm nay. Chấm bù ngày khác thì chọn lại ngày.
2. **Từ – Đến – Nghỉ** — giờ vào, giờ ra và số giờ nghỉ (thường 1 giờ nghỉ trưa). Ô **Số giờ tính công** tự hiện ngay bên dưới.
3. **Tự tính giờ thường / OT theo Luật Lao động — để nguyên dấu tick**. Hệ thống tự chia giờ thường, OT 150%, 200%, 300%, ban đêm, ngày lễ.
4. **Mã công việc** — chọn đúng loại việc (ví dụ *1110 – NI Prod. Hours Fitter* cho giờ lắp đặt).
5. **Tên dự án + Work Number / WBS** — gõ vài chữ tên dự án rồi chọn trong gợi ý, WBS tự điền.
6. **Báo cáo thi công trong ngày** — vài dòng hôm nay làm gì, vướng gì. Giám sát đọc được nội dung này.
7. Lưu.

> 💡 **Một ngày làm 2 dự án?** Thêm 2 dòng, mỗi dòng một khoảng giờ và một dự án.
>
> **Sửa / xoá**: bấm biểu tượng ✏️ hoặc 🗑 ở cuối dòng trong danh sách. Xoá nhầm thì bấm **Hoàn tác** trên thông báo hiện ra.

2.3. Lịch kỳ lương & danh sách chấm công

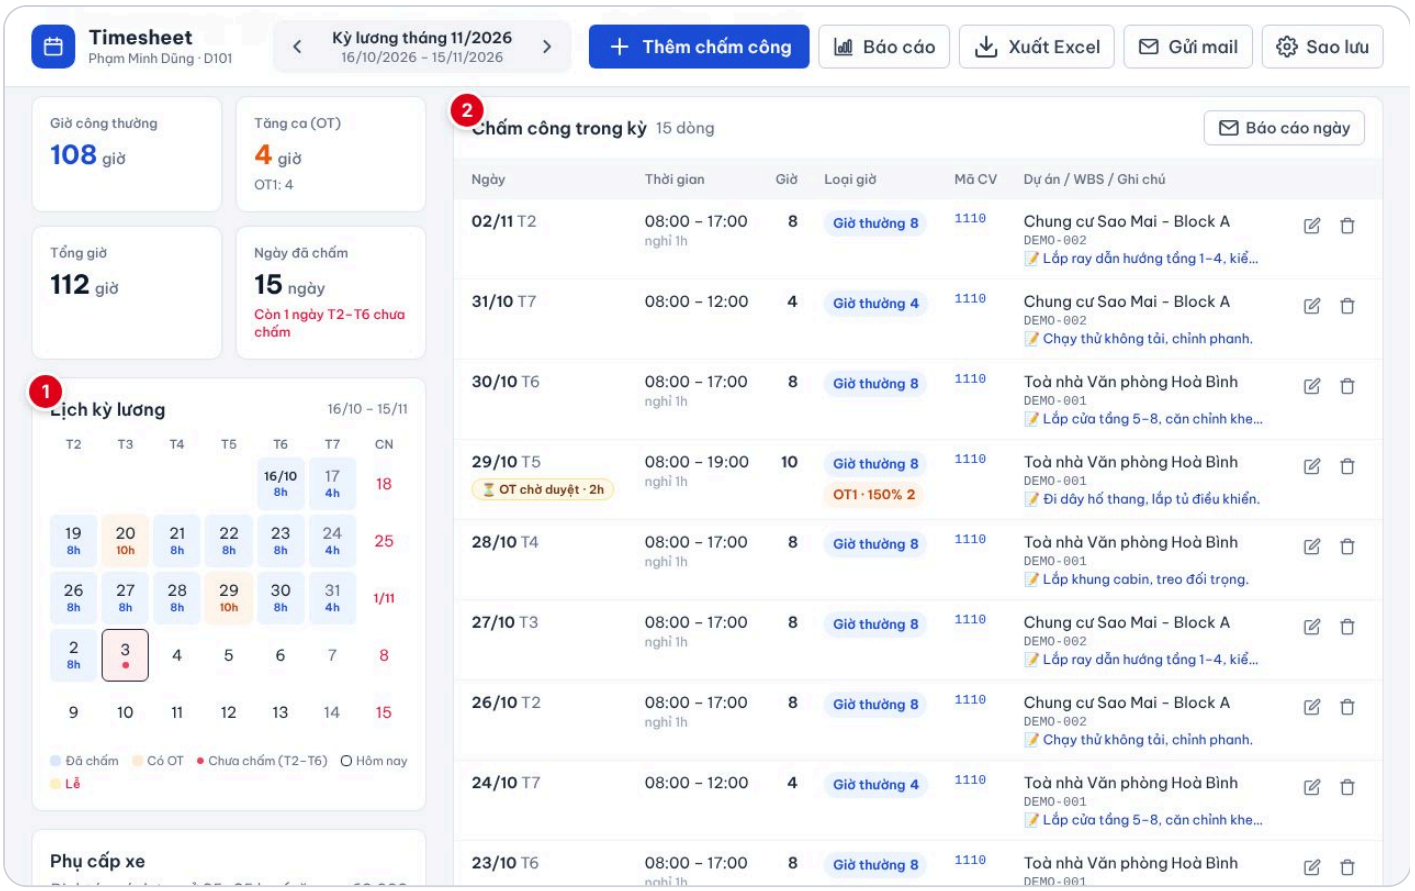


Lịch kỳ lương (trái) và danh sách chấm công (phải)


1. **Lịch kỳ lương** — ngày có **chấm đỏ** là ngày làm việc **chưa chấm công**; ngày xanh là đã chấm (kèm số giờ). Bấm một ngày trên lịch để thêm / xem chấm công ngày đó.
2. **Chấm công trong kỳ** — mọi dòng đã ghi: thời gian, số giờ, loại giờ (thường / OT), mã công việc, dự án và 📝 báo cáo thi công.

2.4. Báo cáo ngày & gửi mail cho giám sát

ℹ️ **Không bắt buộc gửi mail mỗi ngày:** hệ thống **tự gửi email tổng hợp báo cáo thi công lúc 18:30** hằng ngày cho Site Sup / Quản lý dự án của dự án. Hai nút dưới đây dùng khi bạn muốn gửi thêm hoặc gửi gấp.

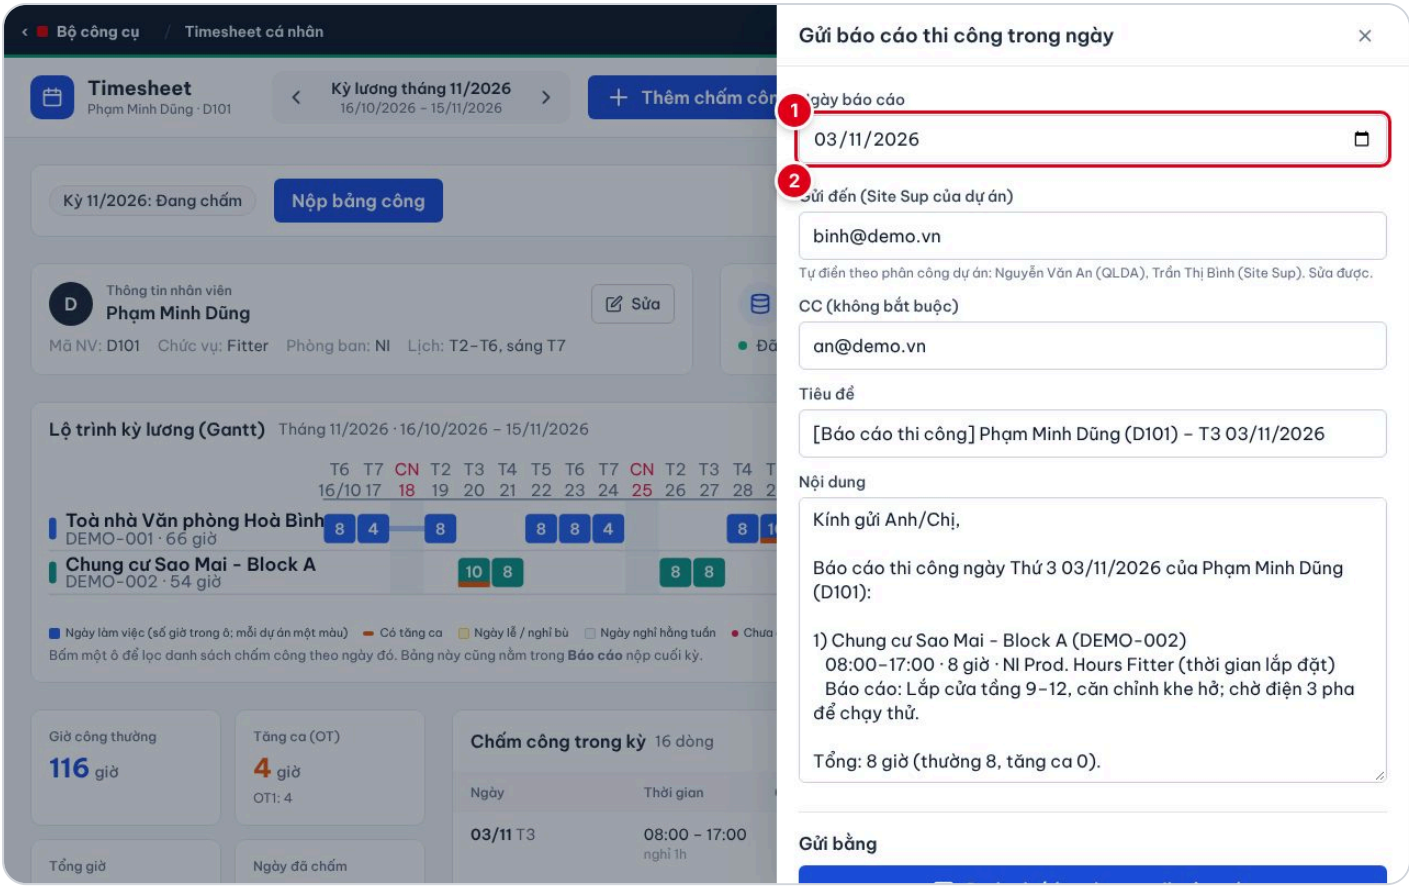

Nút **Báo cáo ngày** (trên danh sách chấm công)

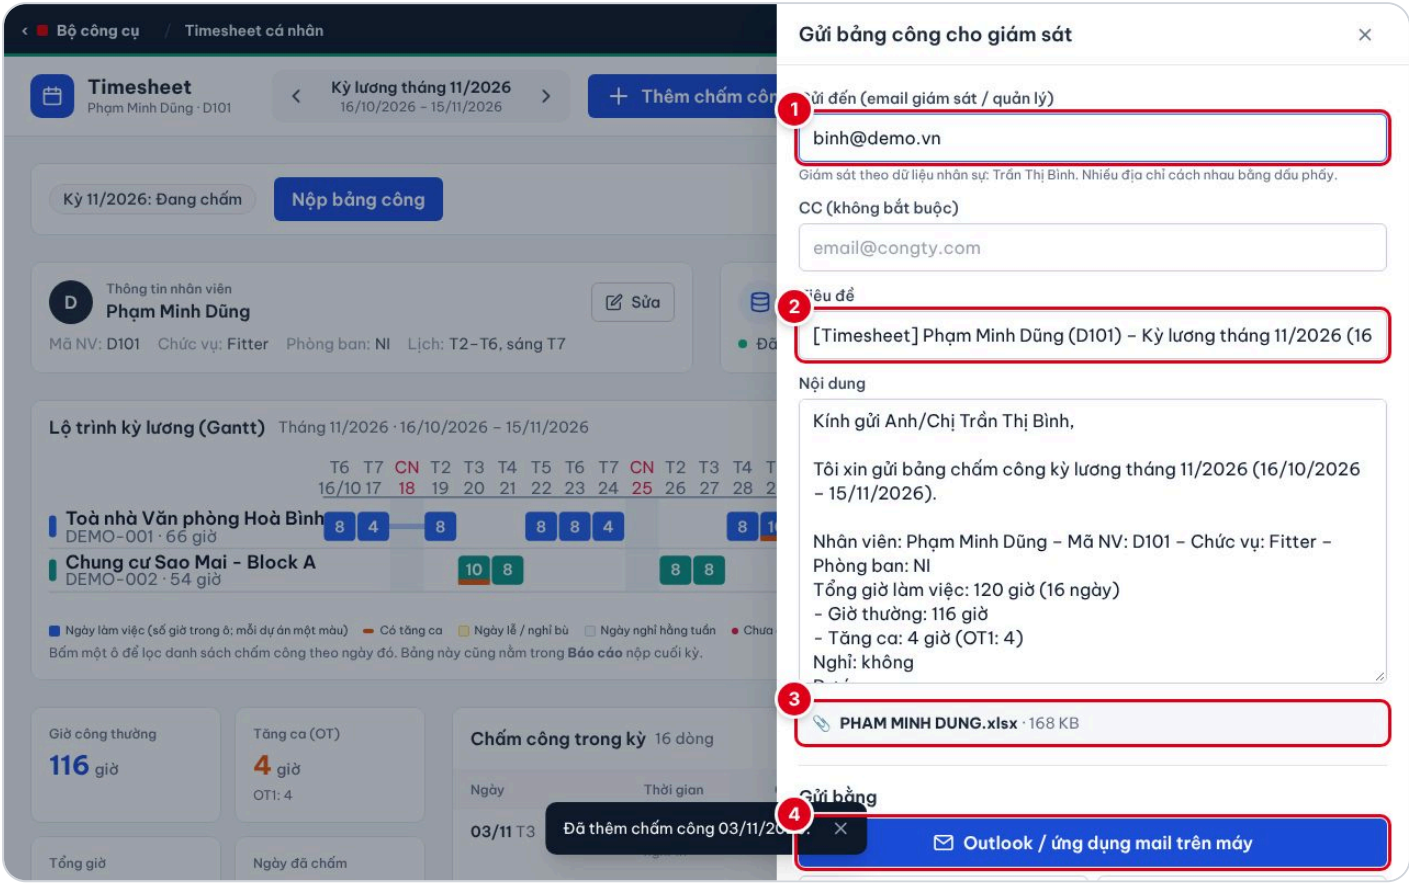

Nút **Gửi mail** (gửi cả bảng công kỳ)


Báo cáo ngày (ảnh trái): ① chọn ngày báo cáo, ② nhập email giám sát (lần sau tự nhớ) — nội dung lấy từ các dòng chấm công và báo cáo thi công của ngày đó.

Gửi mail (ảnh phải):

1. **Gửi đến** — tự điền email giám sát theo dữ liệu nhân sự (sửa được).
2. **Tiêu đề, Nội dung** — soạn sẵn: tổng giờ, giờ thường, tăng ca.
3. **File đính kèm** — file Excel bảng công được tạo sẵn.
4. Chọn cách gửi: **Outlook / ứng dụng mail trên máy**, **Gmail** hoặc **Outlook web**. Trên điện thoại có thêm nút **Chia sẻ** (Zalo, Gmail…).

2.5. Nộp bảng công cuối kỳ

1. Kiểm tra **Lịch kỳ lương**: không còn ngày chấm đỏ (ngày nghỉ phép thì chấm mã nghỉ tương ứng).
2. Từ **ngày 9** app hiện nhắc hạn ⏰; email nhắc vào sáng **ngày 9 và ngày 11**. Hạn cuối là **ngày 12**.
3. Có **phụ cấp xe** (xăng xe 60.000 đ/ngày cho dự án cách trụ sở 25 – dưới 35 km; xe đi tỉnh 1.000.000 đ/tháng khi làm dự án tỉnh trên 20 ngày và tự mang xe): thẻ **Phụ cấp xe** → `Thêm phụ cấp` → chọn loại, dự án (WBS tự điền), khoảng ngày. Số ngày tự tính từ chấm công; phụ cấp được nộp kèm và đính kèm khi Gửi mail.
4. Bấm `Nộp bảng công` → kiểm tra bảng xác nhận (giờ công + phụ cấp xe) → `Nộp cho giám sát`.
5. Trạng thái chuyển thành `Chờ Site Sup`. Bảng công bị **khoá** (không thêm / sửa được) trong lúc chờ duyệt.



Sau khi nộp

1. **Trạng thái kỳ** — theo dõi bảng công đang ở bước nào.
2. `Thu hồi để sửa` — nộp nhầm? Bấm để lấy về sửa tiếp (chỉ được khi giám sát **chưa duyệt**), sửa xong nộp lại.

Các trạng thái bảng công

Đang chấm
Bạn chấm công, sửa thoải mái.

→

Chờ Site Sup
Khoá sửa. Site Sup xem và duyệt.

→

Chờ QLDA
Quản lý dự án duyệt lần 2.


→

Đã duyệt xong
Giờ công tự chuyển sang bảng Theo dõi giờ công.

Ở bất kỳ bước duyệt nào, nếu có sai sót giám sát / quản lý có thể **Bị trả lại** kèm lý do.

> 💡 **Tải file Excel:** chọn đúng kỳ lương rồi bấm **Xuất Excel** (⬇) để tải bảng công (*TÊN VIẾT LIỀN KHÔNG DẤU.xlsx*); ở thẻ **Phụ cấp xe** bấm **Tải form phụ cấp (Excel)** để tải bảng phụ cấp. Tải được cả khi đã nộp. Chi tiết: Hướng dẫn Timesheet.

2.6. Khi bảng công bị trả lại

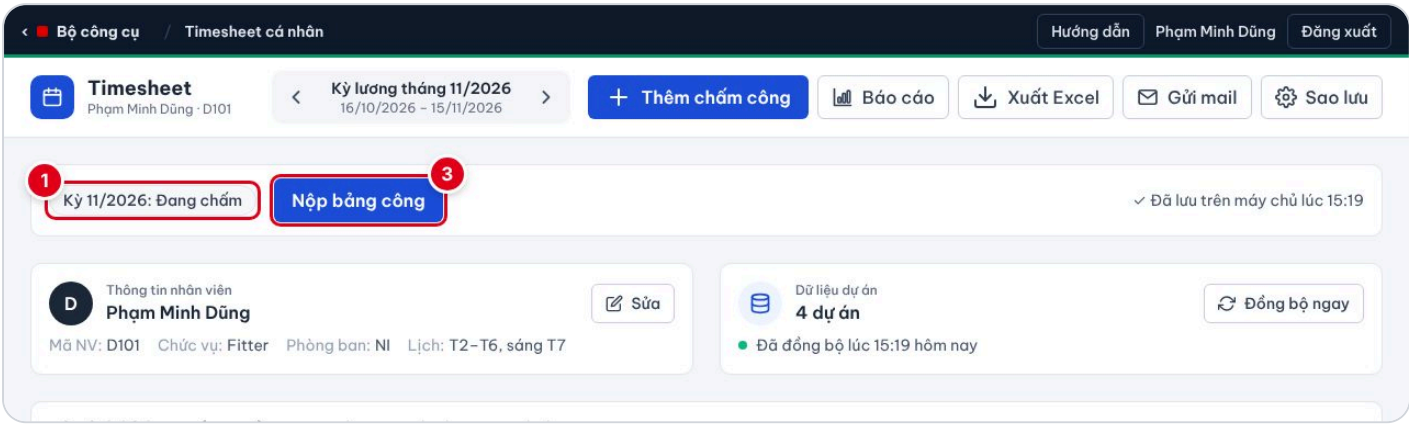

Bảng công bị trả lại

1. Trạng thái đổi thành **Bị trả lại**; bạn cũng nhận email thông báo.
2. **Lý do** của người duyệt hiện ngay bên cạnh — đọc kỹ để sửa đúng chỗ.
3. Sửa các dòng cần sửa, rồi bấm **Nộp bảng công** lại.

2.7. Chấm nhiều ngày, OT, nghỉ phép, thu nhập dự kiến

1. **Nhiều ngày liên tiếp:** trong cửa sổ Thêm chấm công, tick **Chấm nhiều ngày liên tiếp** và chọn **đến ngày** — app tạo mỗi ngày một dòng (có tuỳ chọn bỏ qua Chủ nhật, ngày lễ).
2. **Dự án chưa có trong danh sách:** tự gõ tên dự án / WBS được; app nhớ riêng cho bạn để chọn lại. Dự án / WBS ngoài danh sách chung do Admin dự án duyệt.
3. **OT:** dòng có tăng ca hiện huy hiệu chờ duyệt. OT chưa duyệt **không chặn nộp** bảng công, chỉ có email nhắc. Quên chấm công thì cuối ngày có email nhắc.


4. **Nghỉ phép / ốm:** xin ở trang **Nghỉ phép / ốm** (thẻ trên trang chủ). Hạn nộp: ốm trước 2 giờ; nghỉ 1 ngày trước 24 giờ; 1–3 ngày trước 3 ngày; dài hơn trước 1 tuần. Quản lý trực tiếp duyệt, duyệt xong tự ghi vào bảng công.
5. **Thu nhập dự kiến:** nhập lương cơ bản một lần; app cộng OT + phụ cấp xăng xe. Chỉ lưu trên máy của bạn, **không** gửi lên máy chủ hay email.

Chi tiết có hình: Hướng dẫn Timesheet — mục 7. Giám sát chỉ chấm OT (xin trước khi làm, gửi thẳng Quản lý dự án).

3. Giám sát (Site Sup)

Duyệt bảng công cấp 1, lập hồ sơ chất lượng, theo dõi lịch trình dự án. Site Sup cũng chấm công cá nhân như Fitter (mục 2).

3.1. Trang chủ của giám sát

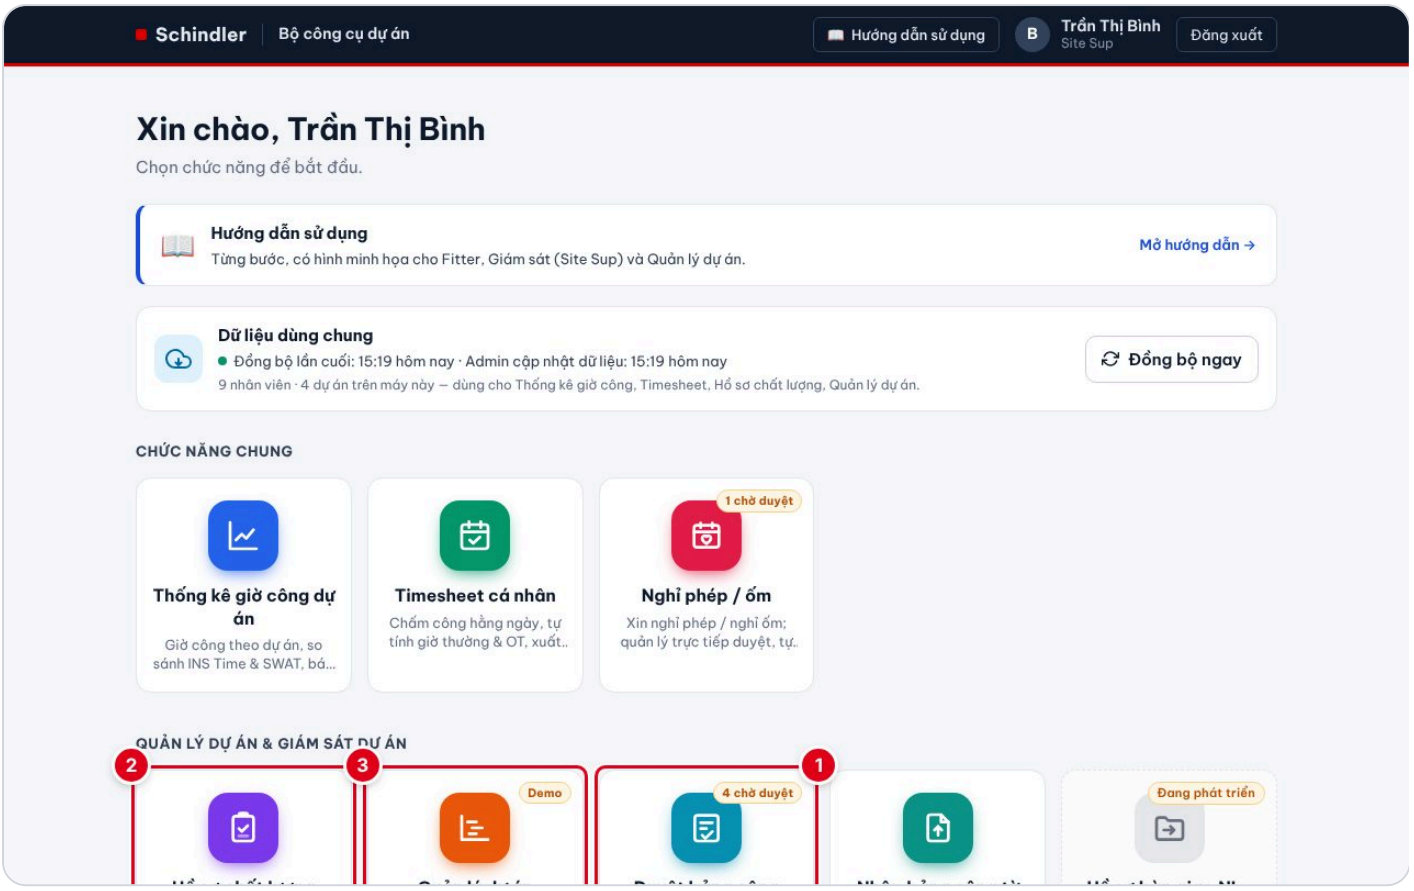


Nhóm chức năng “Quản lý dự án & Giám sát dự án”

1. **Duyệt bảng công** — nhãn đỏ “**N chờ duyệt**” cho biết số bảng công đang chờ bạn.
2. **Hồ sơ chất lượng thang máy** — lập trọn bộ hồ sơ nghiệm thu, biên bản, nhật ký (mục 3.4).
3. **Quản lý dự án** — xem lịch trình các dự án, điều phối fitter (mục 3.3 và phần 4).

3.2. Duyệt bảng công (cấp 1), OT và nghỉ phép


Quy trình mới: bảng công đi qua 3 cấp — **mọi Site Sup** của các dự án trong bảng công → **mọi Quản lý dự án** của các dự án đó → **Admin xử lý cuối**. Ngoài ra bạn duyệt **OT từng ngày** ngay trong trang Duyệt bảng công (mục *Tăng ca chờ duyệt*); đơn **nghỉ phép / ốm** do **quản lý trực tiếp** duyệt ở trang **Nghỉ phép / ốm**. Email 18:30 có tiêu đề *Tên fitter - Dự án - WBS - Chấm công/báo cáo ngày dd.mm.yyyy*, chỉ có nút duyệt khi có OT / nghỉ phép cần duyệt. Ngày fitter có giờ OT thì tiêu đề là *... - Đề nghị phê duyệt OT và chấm công ngày dd.mm.yyyy*; phần chấm công sau 18:30 được gửi trong thư tổng hợp 8:00 sáng hôm sau. Chi tiết: Hướng dẫn Timesheet — mục 8.


Bạn chỉ thấy bảng công của fitter làm ở **dự án bạn phụ trách**. Nên duyệt sớm sau khi fitter nộp để Quản lý dự án kịp duyệt. Sơ đồ khối + checklist 5 điểm: Hướng dẫn Timesheet — phần Giám sát.

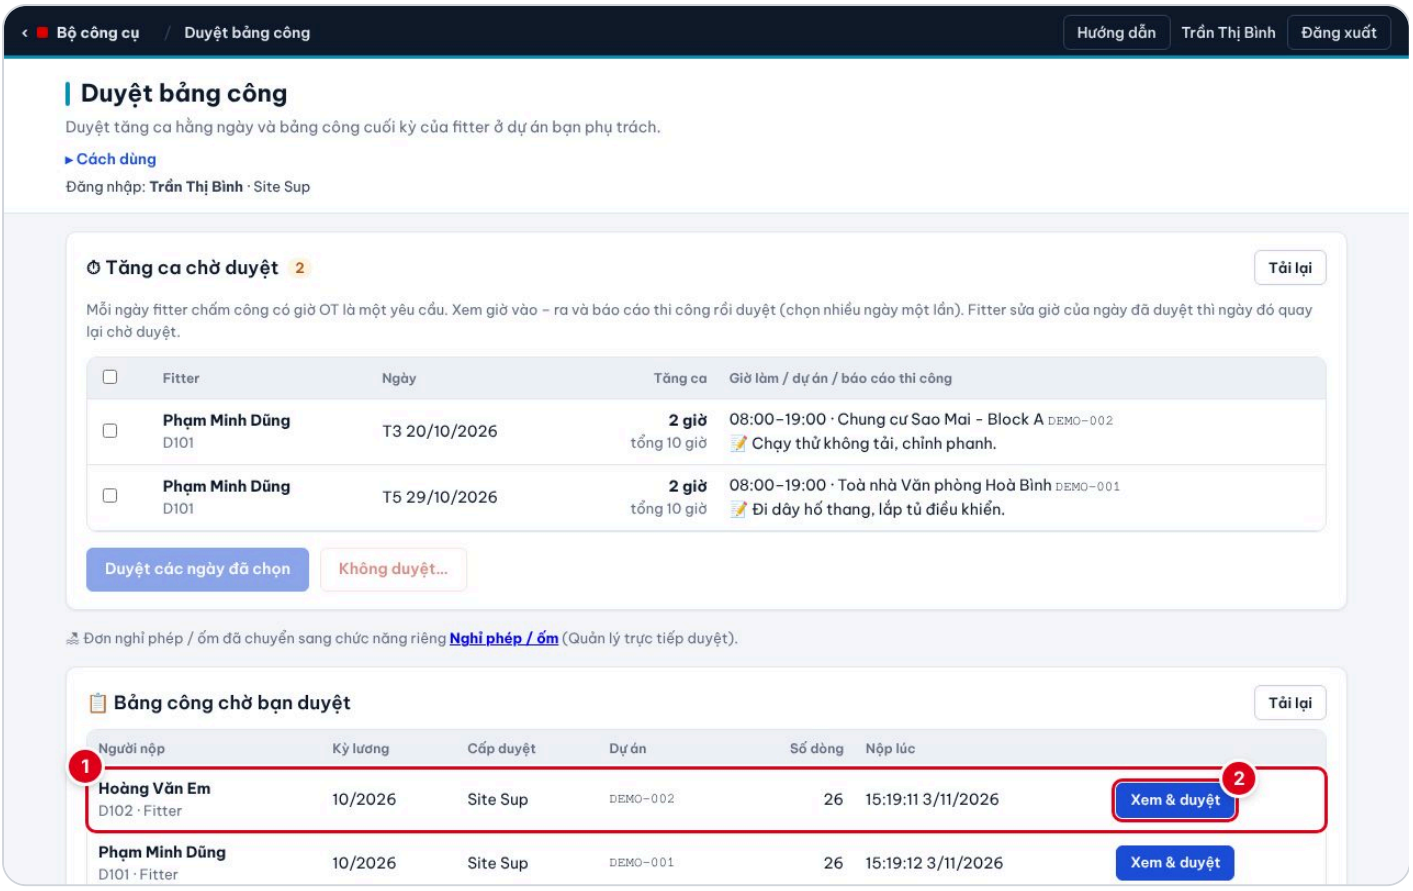

Hộp "Chờ bạn duyệt"


1. Mỗi dòng: **người nộp, kỳ lương, cấp duyệt** (Site Sup / Quản lý dự án), **dự án**, số dòng, thời điểm nộp.
2. Xem & duyệt — mở chi tiết.

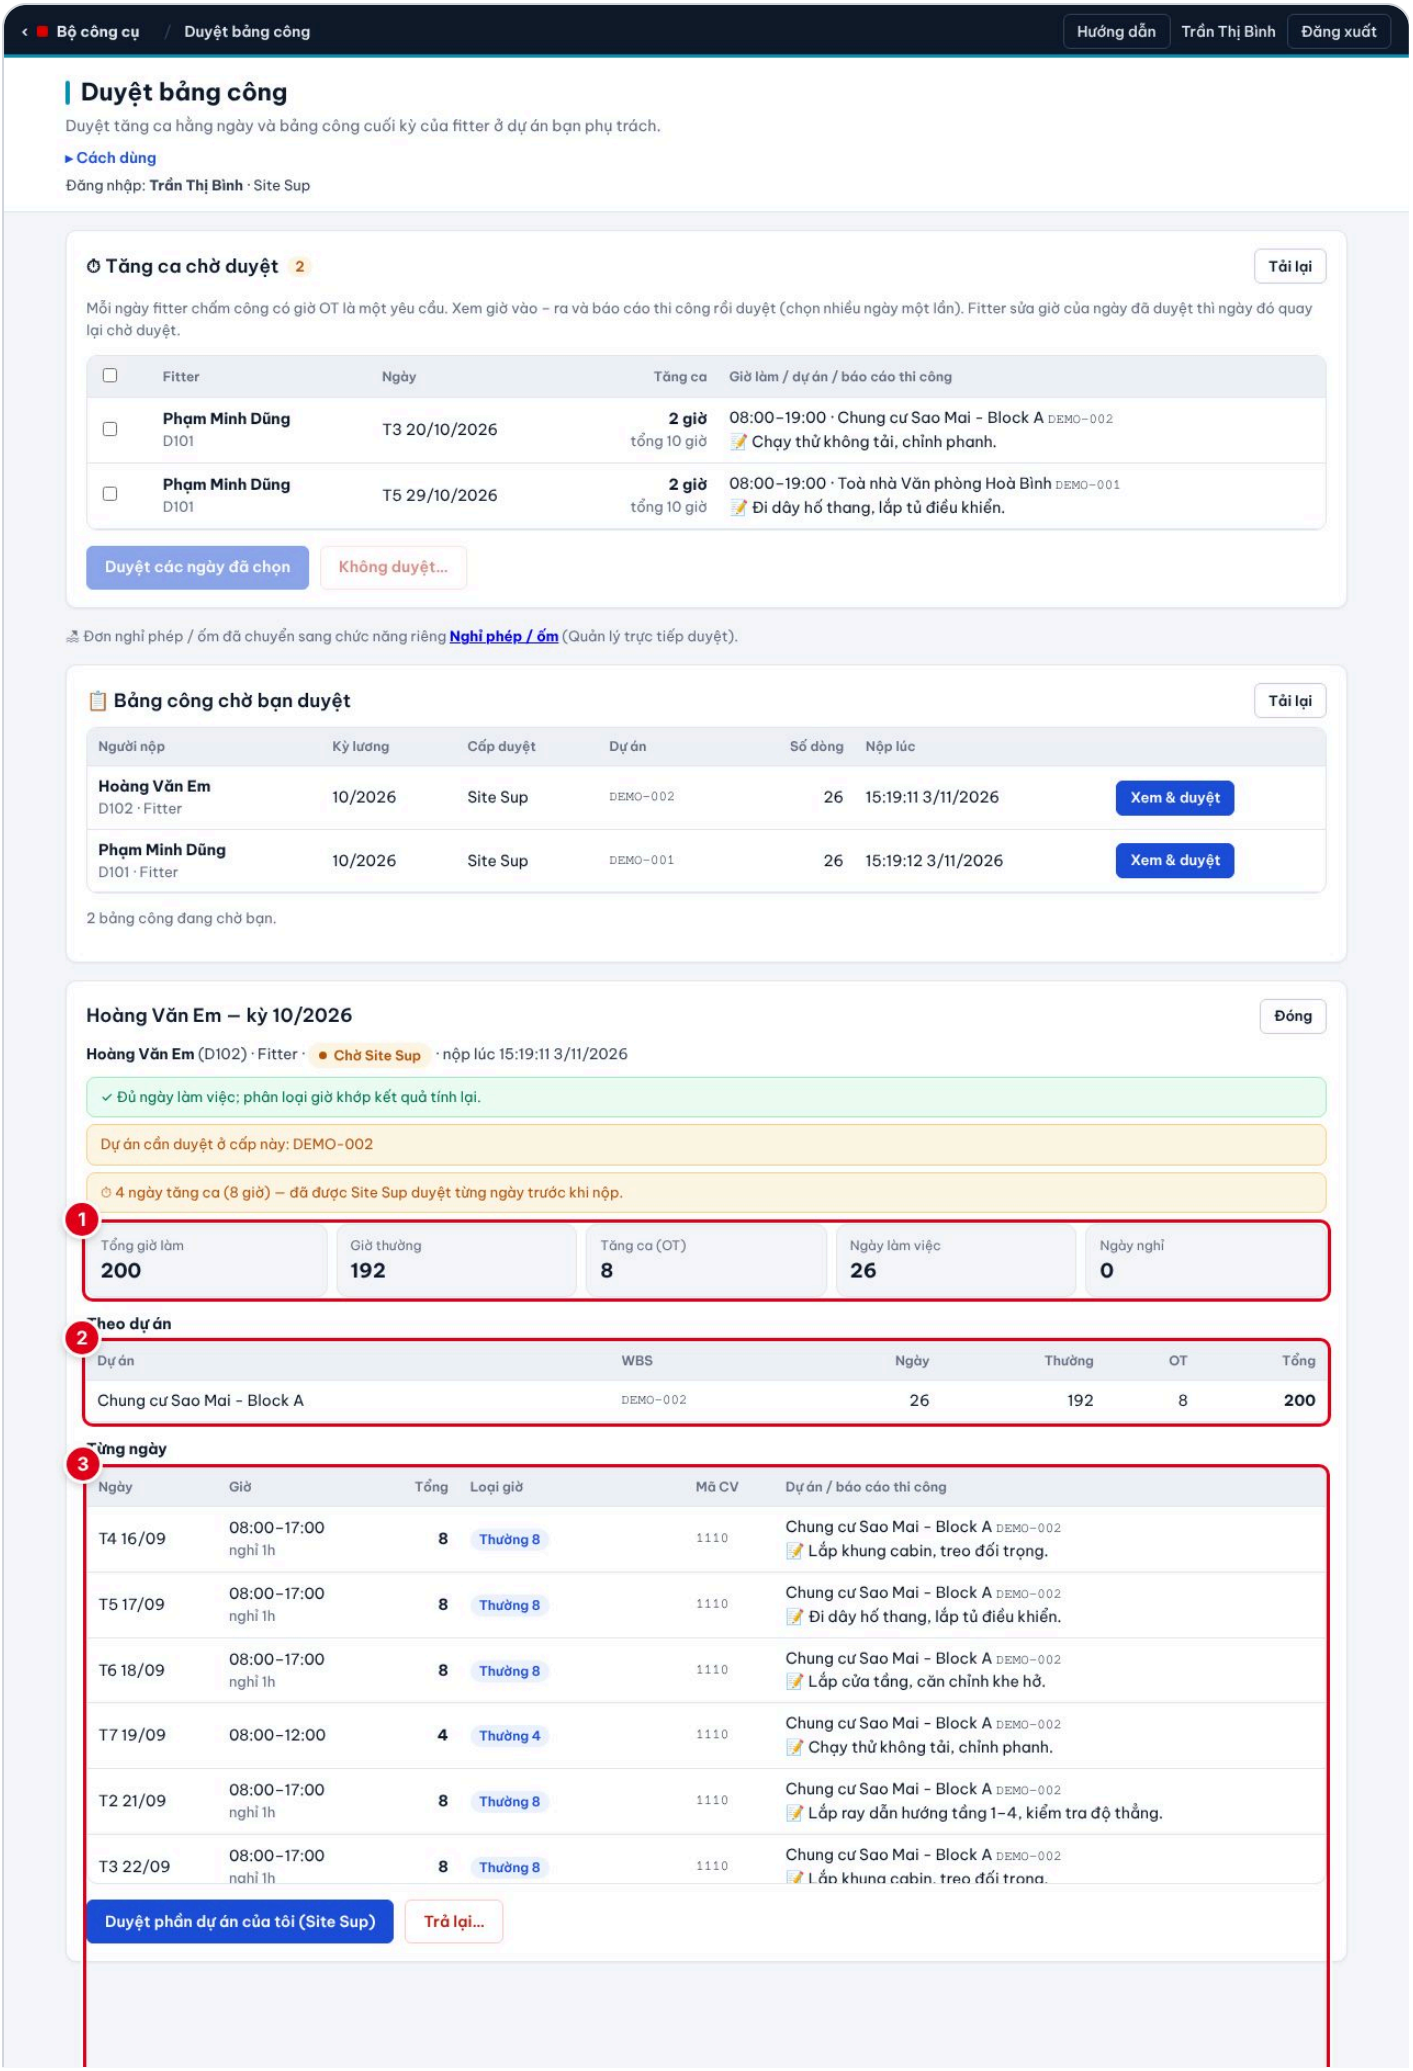
‹ Bộ công cụ / Duyệt bảng công
Hướng dẫn
Trần Thị Bình
Đăng xuất
Duyệt bảng công
Duyệt tăng ca hằng ngày và bảng công cuối kỳ của fitter ở dự án bạn phụ trách.
▸ Cách dùng
Đăng nhập: Trần Thị Bình · Site Sup
⏱ Tăng ca chờ duyệt 2
Tải lại
Mỗi ngày fitter chấm công có giờ OT là một yêu cầu. Xem giờ vào – ra và báo cáo thi công rồi duyệt (chọn nhiều ngày một lần). Fitter sửa giờ của ngày đã duyệt thì ngày đó quay lại chờ duyệt.
Fitter
Ngày
Tăng ca
Giờ làm / dự án / báo cáo thi công
Phạm Minh Dũng
D101
T3 20/10/2026
2 giờ
tổng 10 giờ
08:00–19:00 · Chung cư Sao Mai - Block A DEMO-002
📝 Chạy thử không tải, chỉnh phanh.
Phạm Minh Dũng
D101
T5 29/10/2026
2 giờ
tổng 10 giờ
08:00–19:00 · Toà nhà Văn phòng Hoà Bình DEMO-001
📝 Đi dây hố thang, lắp tủ điều khiển.
Duyệt các ngày đã chọn
Không duyệt...
🏖 Đơn nghỉ phép / ốm đã chuyển sang chức năng riêng Nghỉ phép / ốm (Quản lý trực tiếp duyệt).
📋 Bảng công chờ bạn duyệt
Tải lại
Người nộp
Kỳ lương
Cấp duyệt
Dự án
Số dòng
Nộp lúc
Hoàng Văn Em
D102 · Fitter
10/2026
Site Sup
DEMO-002
26
15:19:11 3/11/2026
Xem & duyệt
Phạm Minh Dũng
D101 · Fitter
10/2026
Site Sup
DEMO-001
26
15:19:12 3/11/2026
Xem & duyệt
2 bảng công đang chờ bạn.
Hoàng Văn Em – kỳ 10/2026
Đóng
Hoàng Văn Em (D102) · Fitter · Chờ Site Sup · nộp lúc 15:19:11 3/11/2026
✓ Đủ ngày làm việc; phân loại giờ khớp kết quả tính lại.
Dự án cần duyệt ở cấp này: DEMO-002
⏱ 4 ngày tăng ca (8 giờ) – đã được Site Sup duyệt từng ngày trước khi nộp.
1
Tổng giờ làm
200
Giờ thường
192
Tăng ca (OT)
8
Ngày làm việc
26
Ngày nghỉ
0
Theo dự án
2
Dự án
WBS
Ngày
Thường
OT
Tổng
Chung cư Sao Mai - Block A
DEMO-002
26
192
8
200
Từng ngày
3
Ngày
Giờ
Tổng
Loại giờ
Mã CV
Dự án / báo cáo thi công
T4 16/09
08:00–17:00
nghỉ 1h
8
Thường 8
1110
Chung cư Sao Mai - Block A DEMO-002
📝 Lắp khung cabin, treo đối trọng.
T5 17/09
08:00–17:00
nghỉ 1h
8
Thường 8
1110
Chung cư Sao Mai - Block A DEMO-002
📝 Đi dây hố thang, lắp tủ điều khiển.
T6 18/09
08:00–17:00
nghỉ 1h
8
Thường 8
1110
Chung cư Sao Mai - Block A DEMO-002
📝 Lắp cửa tầng, căn chỉnh khe hở.
T7 19/09
08:00–12:00
4
Thường 4
1110
Chung cư Sao Mai - Block A DEMO-002
📝 Chạy thử không tải, chỉnh phanh.
T2 21/09
08:00–17:00
nghỉ 1h
8
Thường 8
1110
Chung cư Sao Mai - Block A DEMO-002
📝 Lắp ray dẫn hướng tầng 1–4, kiểm tra độ thẳng.
T3 22/09
08:00–17:00
nghỉ 1h
8
Thường 8
1110
Chung cư Sao Mai - Block A DEMO-002
📝 Lắp khung cabin, treo đối trọng.
Duyệt phần dự án của tôi (Site Sup)
Trả lại...



Chi tiết một bảng công

1. **Tổng quan**: giờ công, giờ thường, tăng ca, số ngày; dòng cảnh báo vàng liệt kê **ngày làm việc chưa chấm**.
2. **Theo dự án**: số ngày, giờ thường, OT của từng dự án — so với thực tế công trường.
3. **Từng ngày**: giờ vào – ra, loại giờ, mã công việc, dự án và **báo cáo thi công**. Dòng **tô đỏ** là dòng có phân loại giờ không khớp quy định → nên trả lại để fitter mở lại Timesheet và nộp lại.

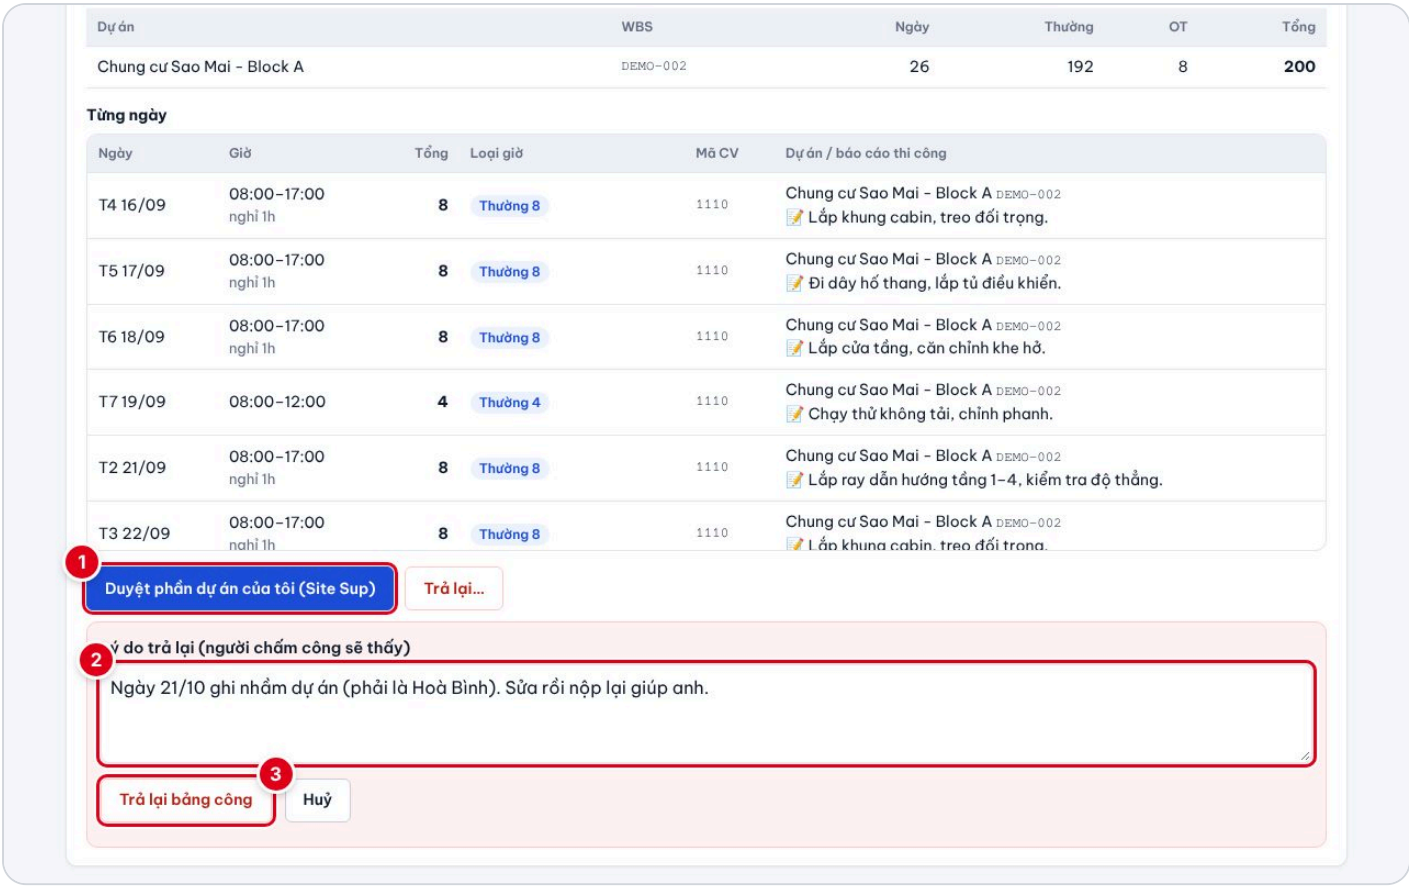


Cuối trang chi tiết: Duyệt hoặc Trả lại

1. **Duyệt (chuyển sang Quản lý dự án)** — đúng thì bấm duyệt; bảng công chuyển lên Quản lý dự án.
2. Thấy sai: bấm **Trả lại...**, ghi **lý do cụ thể** (ngày nào, sai gì) — **bắt buộc**, fitter sẽ đọc lý do này.
3. **Trả lại bảng công** để gửi.

> 💡 Hằng tối **18:30** bạn nhận email tổng hợp: **chấm công + báo cáo thi công trong ngày** của fitter ở dự án mình, **bảng công đang chờ bạn duyệt** (bấm tên là mở thẳng bảng công) và **fitter chưa chấm công hôm nay**. Khi fitter nộp, email có nút **Mở bảng công để duyệt**. Sáng ngày 11 có email nhắc nếu còn bảng công chờ bạn duyệt.

3.3. Xem lại lịch trình dự án

Mở **Quản lý dự án → tab Lịch trình dự án → Lịch trình (Gantt)**, bấm `Dự án của tôi` để chỉ xem dự án mình giám sát.

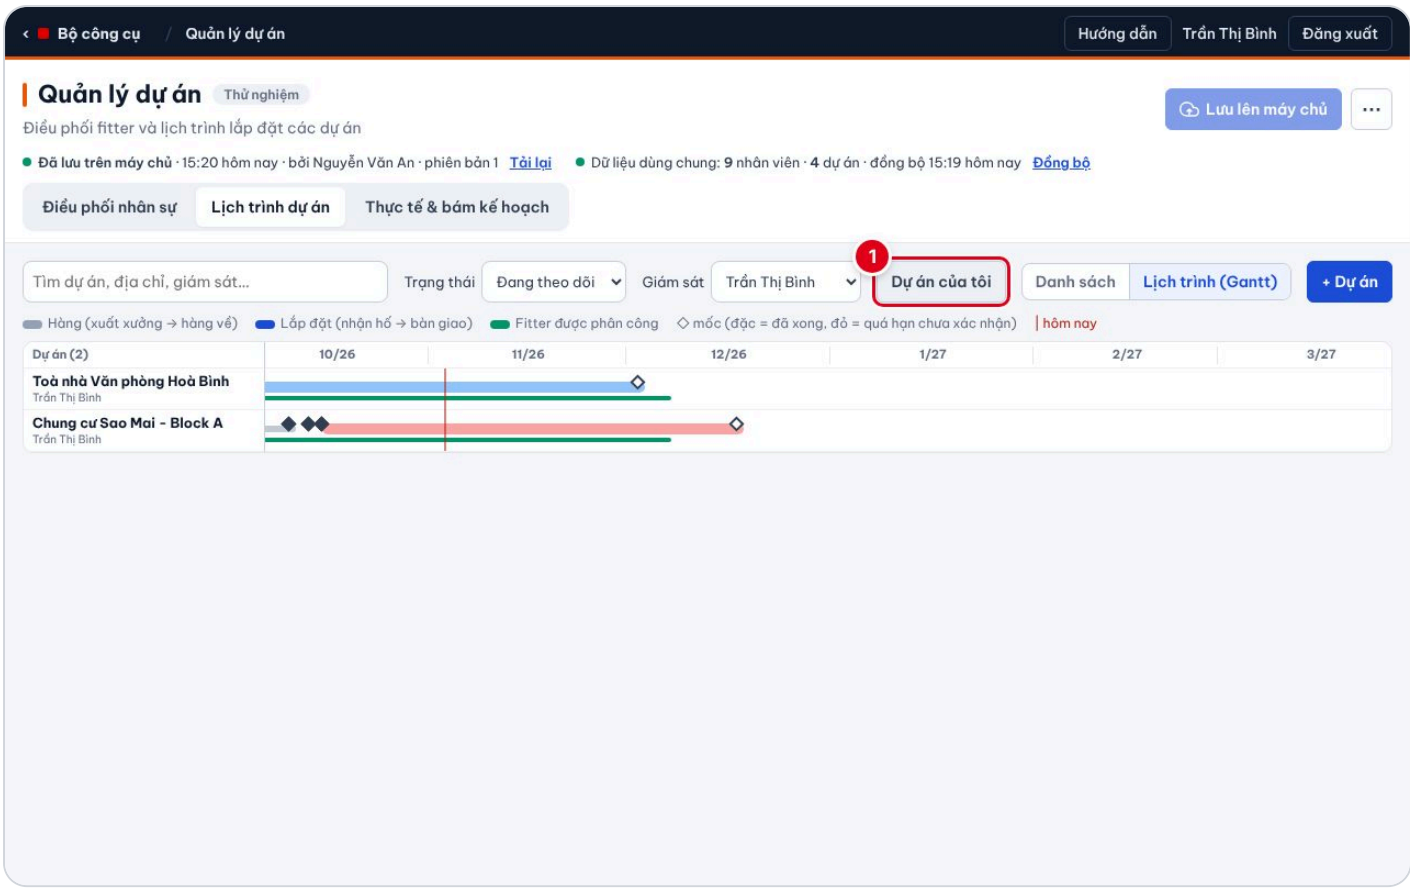

Lịch trình các dự án của tôi

1 Dự án của tôi — lọc nhanh theo tên giám sát của bạn.


Ký hiệu trên Gantt	Ý nghĩa
▬	Hàng: từ xuất xưởng đến hàng về
▬	Lắp đặt: từ nhận hố đến bàn giao (màu của dự án)
▬	Thời gian có fitter được phân công
◇ / ◆ / ◇ đỏ	Mốc chưa xong / đã xong / quá hạn chưa xác nhận
|	Hôm nay

Bấm tên dự án để mở chi tiết: ngày hàng về, giao hố, nhận hố, bàn giao, ghi chú. Chi tiết các thao tác xem mục 4.3.

3.4. Hồ sơ chất lượng thang máy

Lập trọn bộ hồ sơ nghiệm thu (.docx, mở bằng Word để in), biên bản hàng về, biên bản bàn giao thang và nhật ký thi công — chỉ cần nhập thông tin một lần.


Bước 1 — Nhập hợp đồng

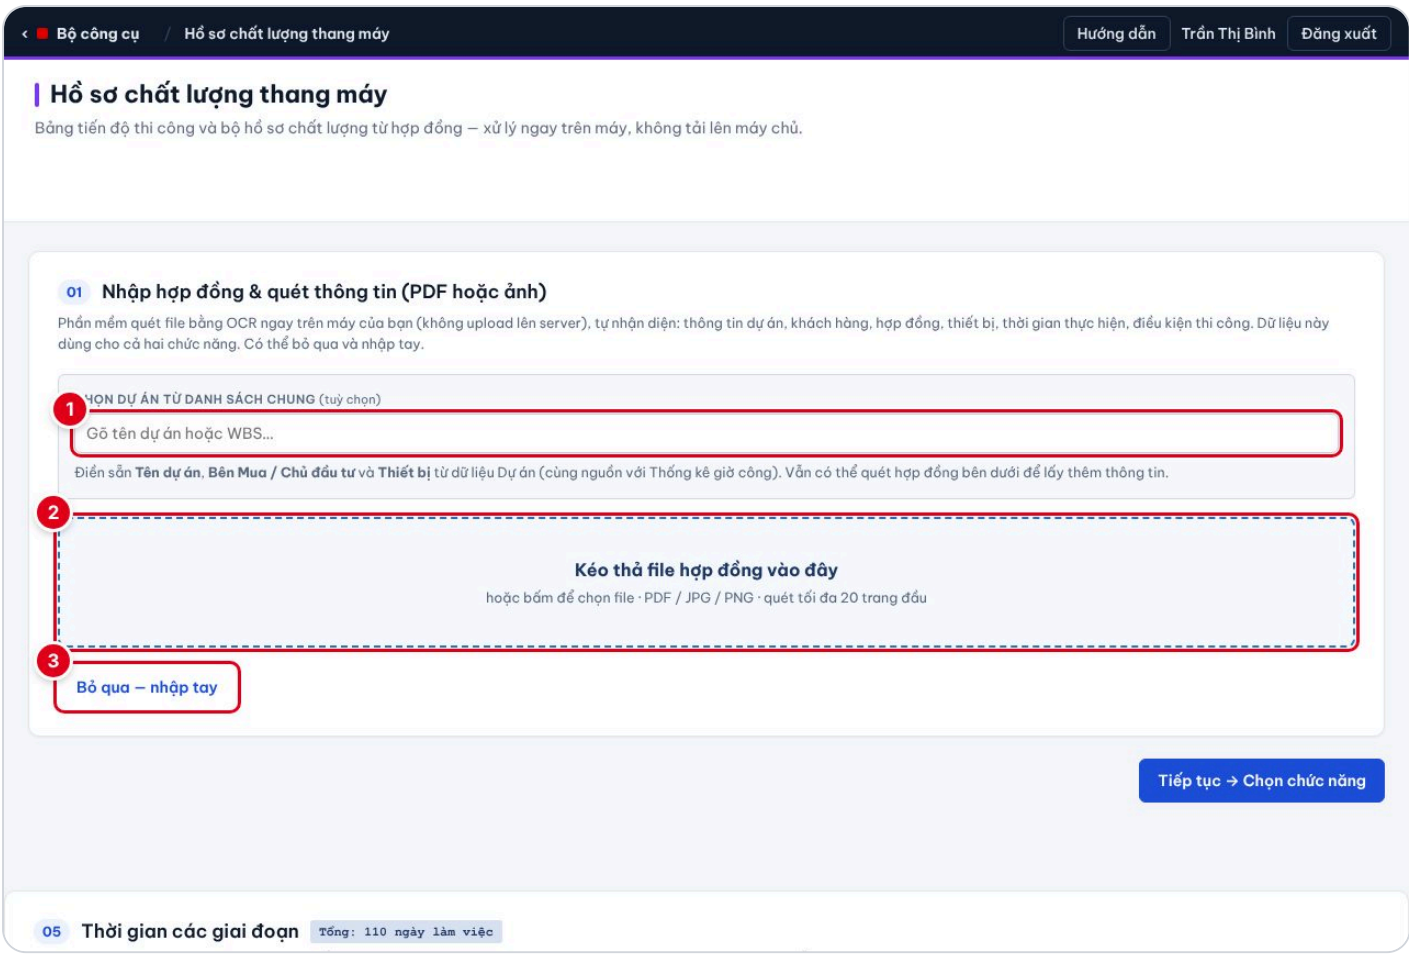

Màn hình đầu

1. **Chọn dự án từ danh sách chung** — gõ tên / WBS để điền sẵn tên dự án, chủ đầu tư, thiết bị.
2. **Kéo thả file hợp đồng** (PDF / ảnh) — app tự quét để lấy số hợp đồng, ngày ký, các bên… (xử lý ngay trên máy, không gửi file đi đâu).
3. Hoặc `Bỏ qua — nhập tay`.

Bước 2 — Chọn chức năng

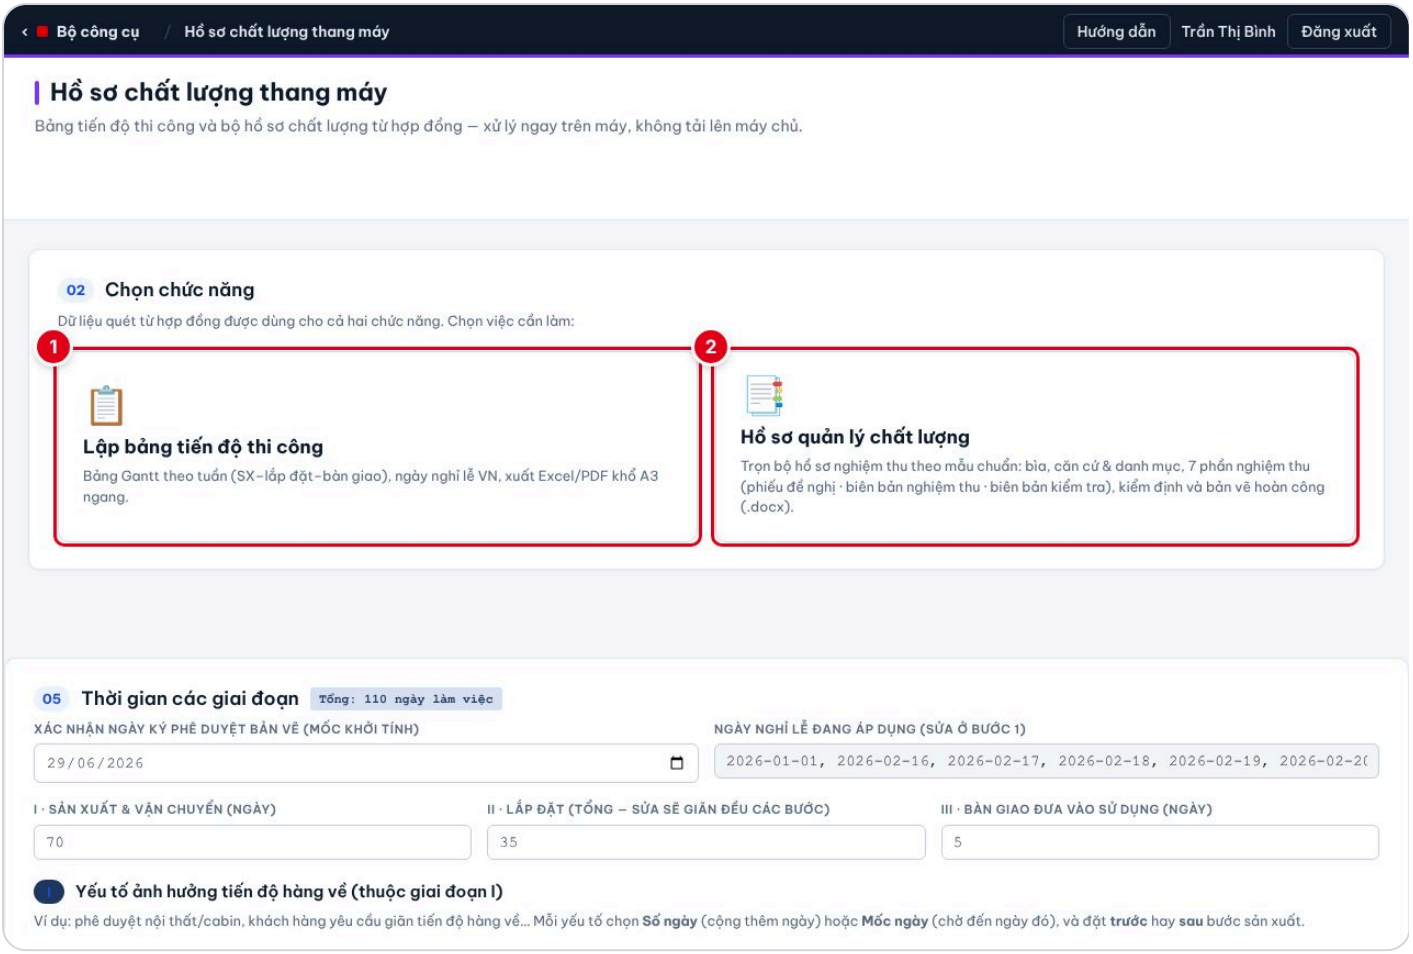


Hai chức năng dùng chung dữ liệu hợp đồng

1. **Lập bảng tiến độ thi công** — Gantt theo tuần, xuất Excel / PDF khổ A3 (xem mục 4.5).
2. **Hồ sơ quản lý chất lượng** — bộ hồ sơ nghiệm thu Word.


Bước 3 — Điền thông tin hồ sơ

Điền lần lượt các mục A → F. Ô để trống sẽ in dấu chấm để điền tay sau.

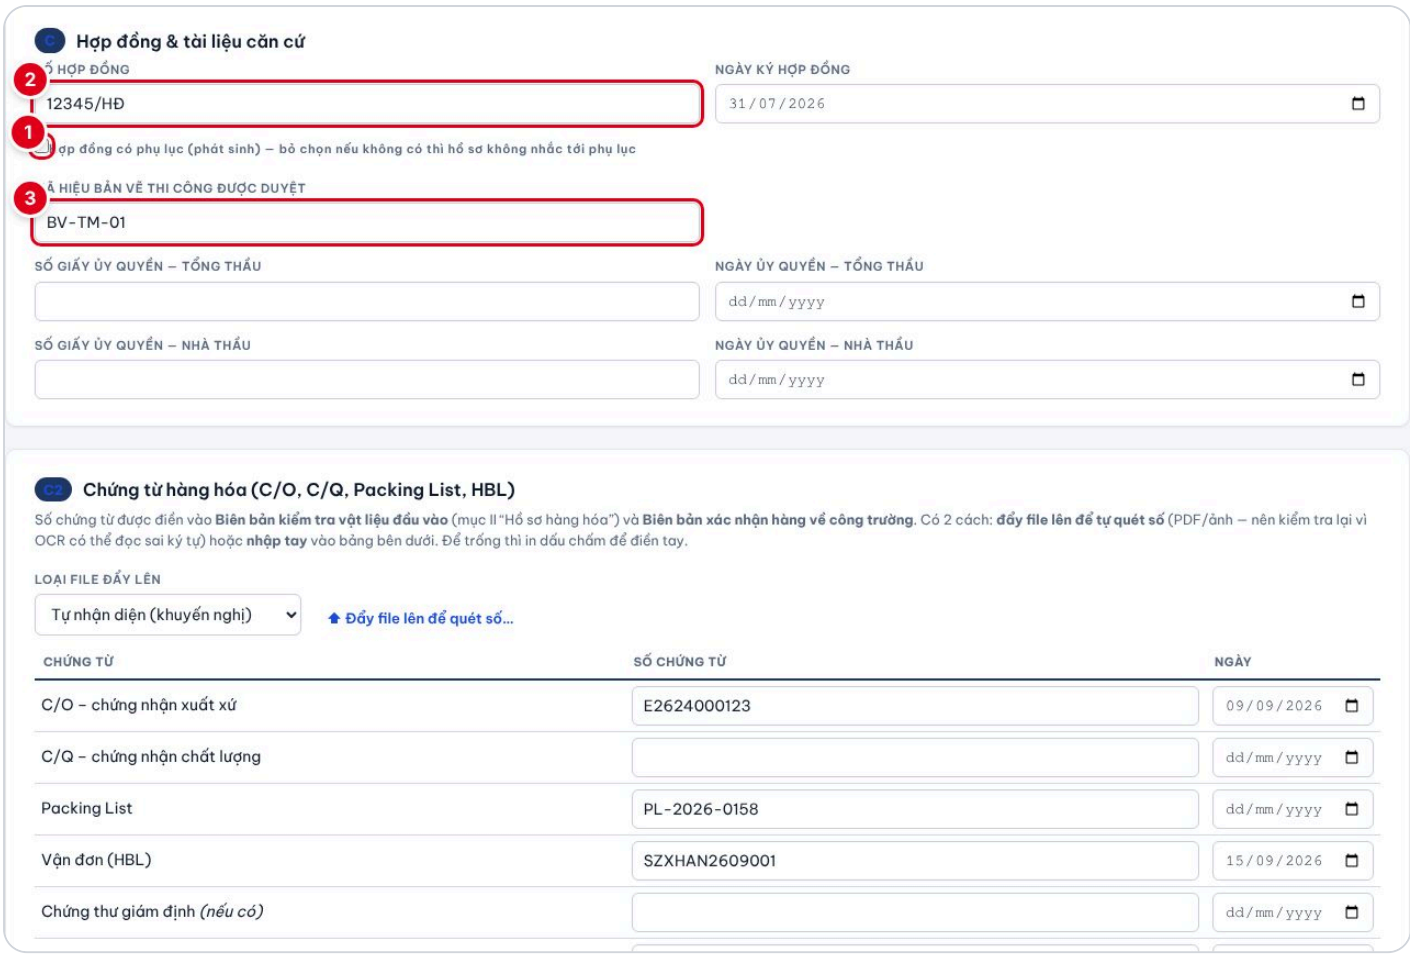


Mục C — Hợp đồng & tài liệu căn cứ

1. **Hợp đồng có phụ lục** — chỉ tick khi thật sự có phụ lục; không tick thì toàn bộ hồ sơ **không nhắc tới phụ lục**.
2. Số và ngày ký hợp đồng.
3. Mã hiệu bản vẽ thi công được duyệt.

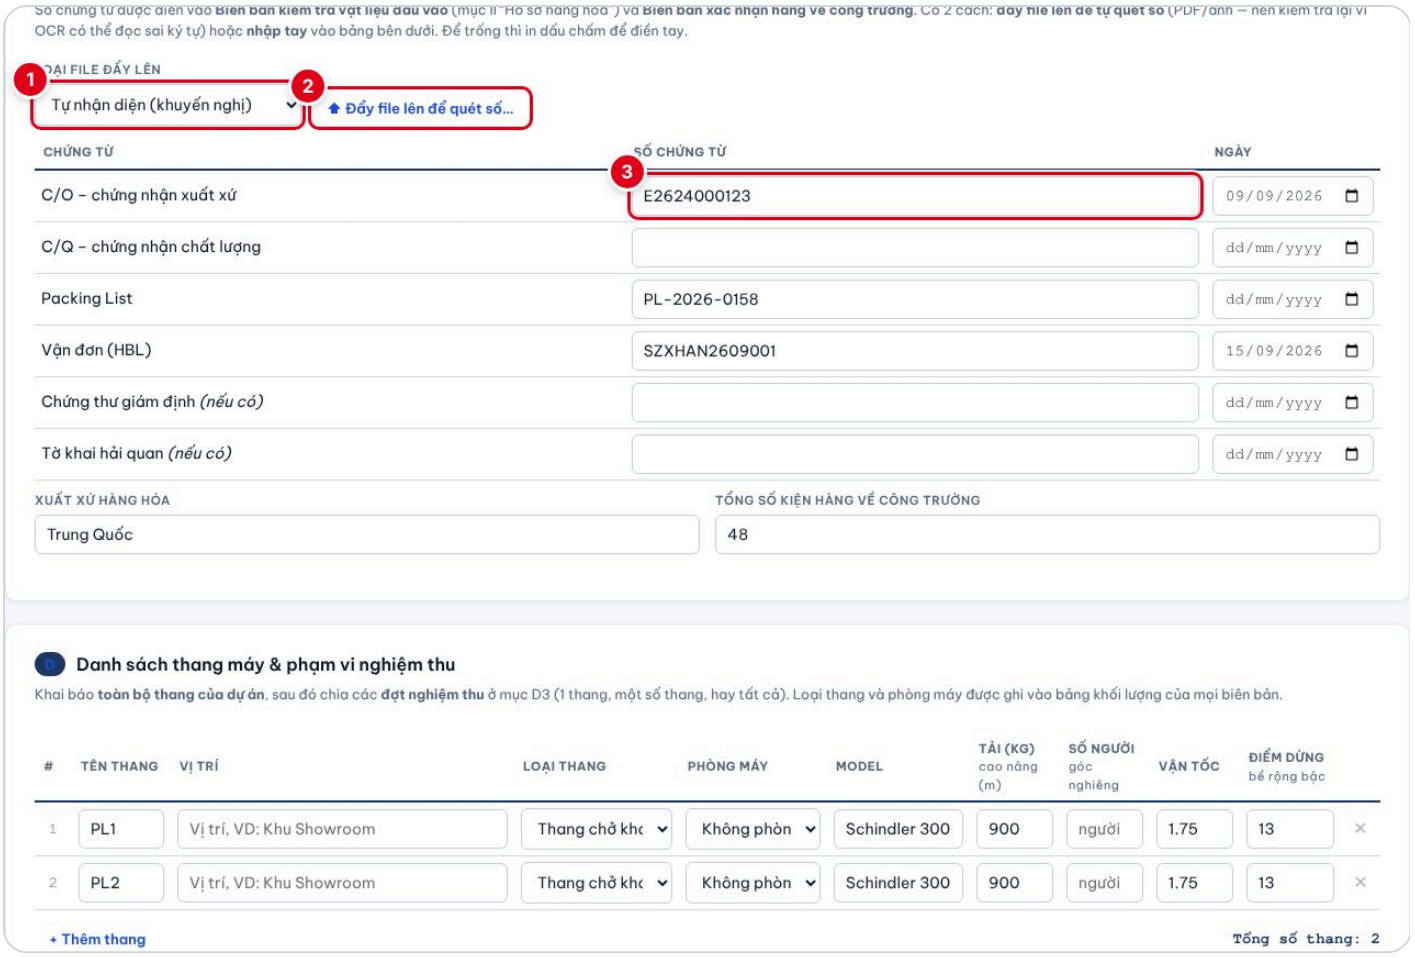


Mục C2 — Chứng từ hàng hóa (C/O, C/Q, Packing List, HBL)

1. **Loại file** — để "Tự nhận diện" hoặc chọn đúng loại nếu đẩy từng loại.
2. ⬆ Đẩy file lên để quét số... — chọn một hay nhiều file PDF / ảnh; app tự đọc **số và ngày** chứng từ, xuất xứ, số kiện.
3. Kết quả điền vào bảng — **luôn đối chiếu với bản gốc** (máy có thể đọc nhầm ký tự). Có thể gõ tay trực tiếp.

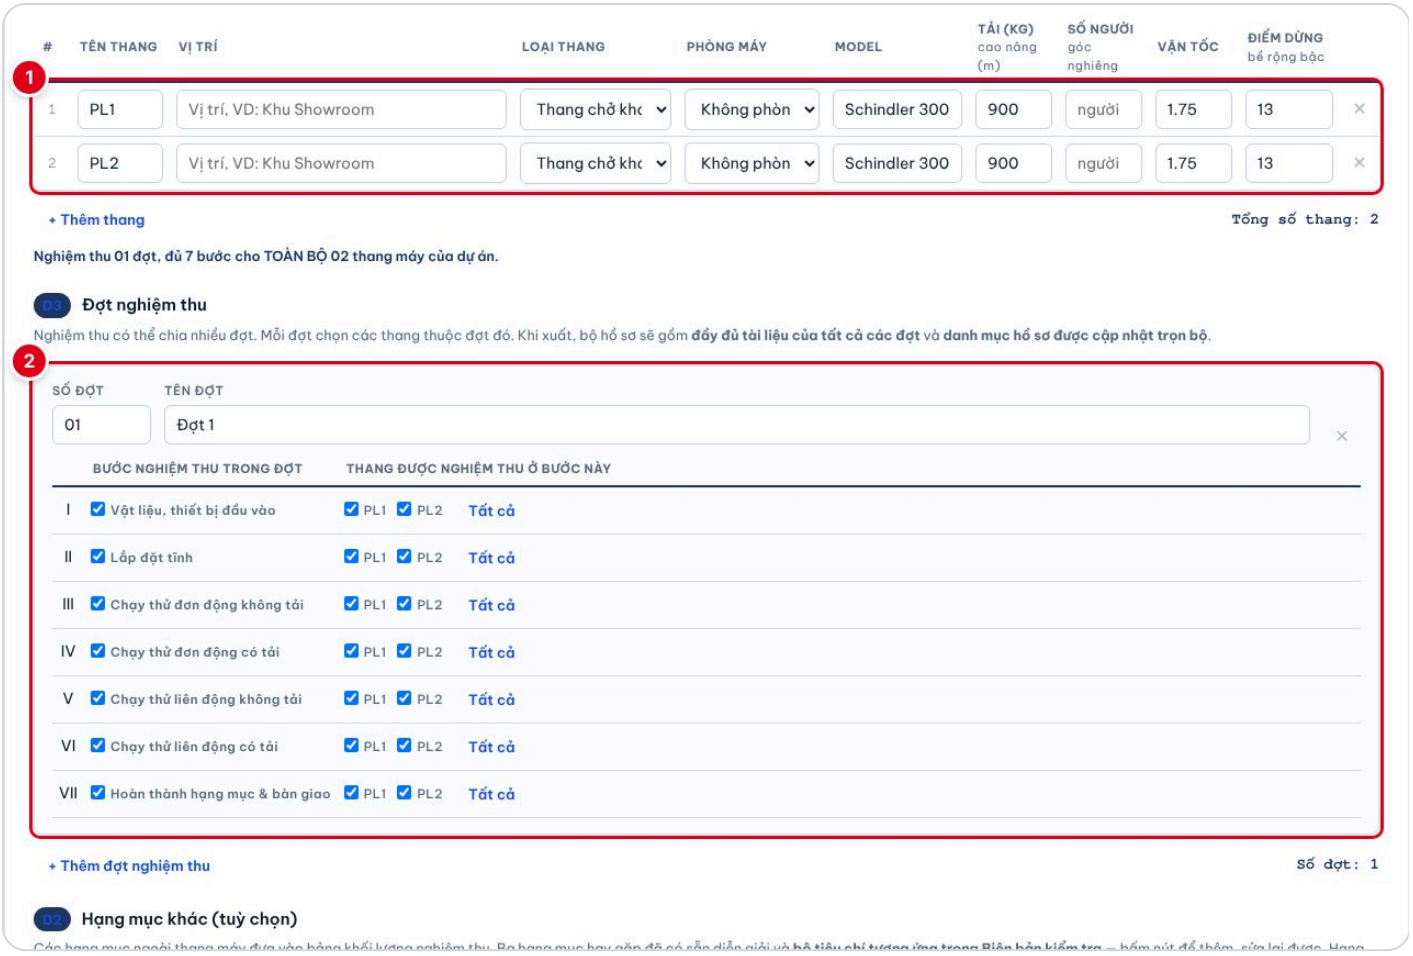


Mục D — Danh sách thang & đợt nghiệm thu

1. Khai báo **toàn bộ thang** của dự án: tên, loại, model, tải, tốc độ, số điểm dừng…
2. **Đợt nghiệm thu**: mỗi đợt chọn các bước (vật liệu đầu vào, lắp đặt tĩnh, chạy thử…, hoàn thành) và thang thuộc bước đó.

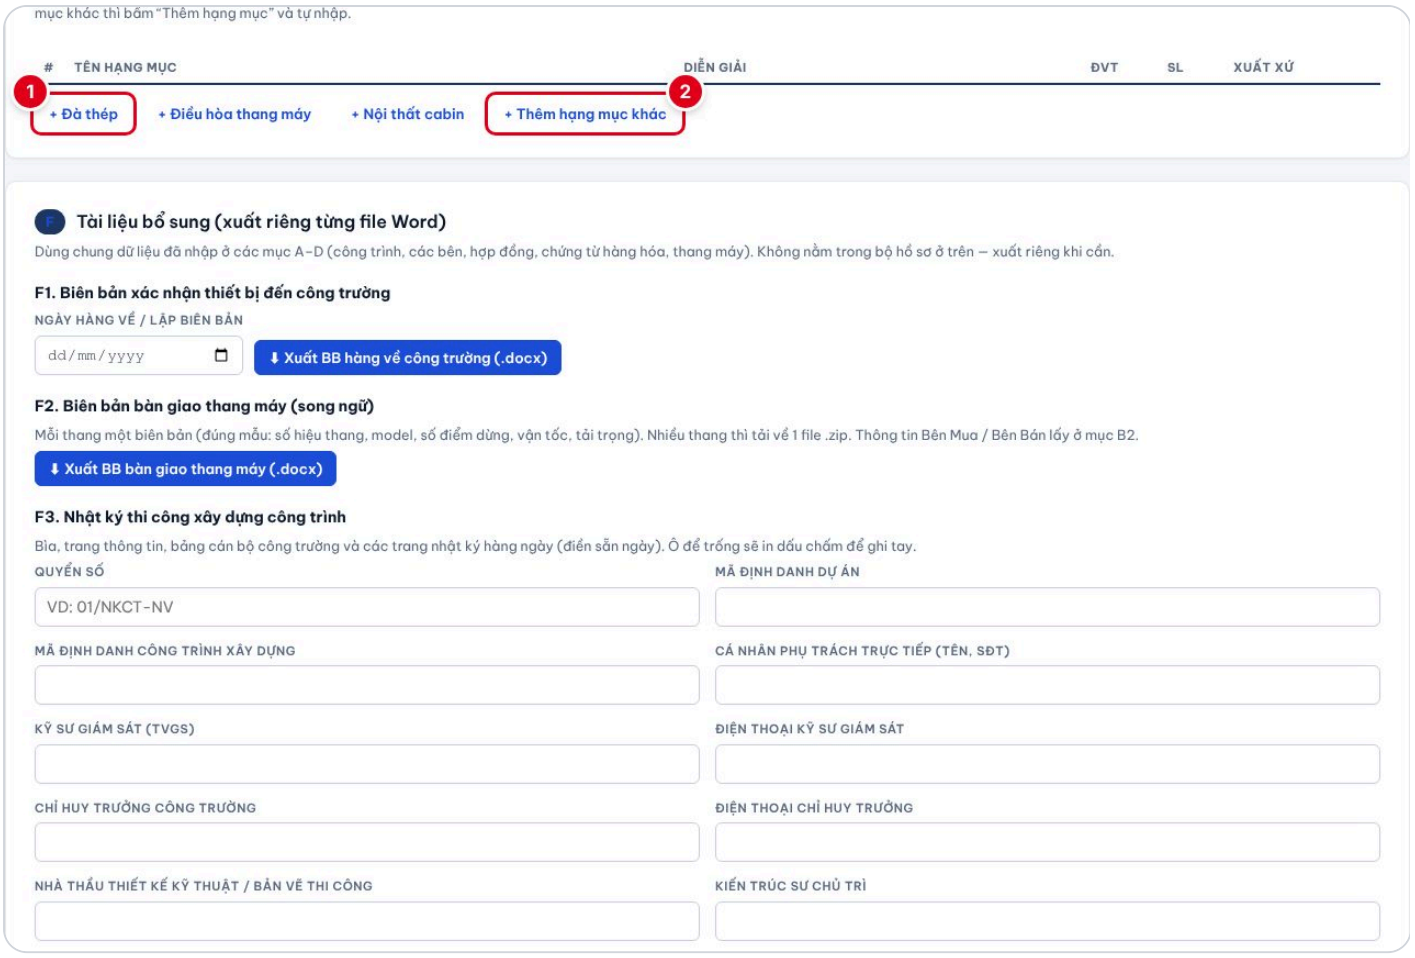

Mục D2 — Hạng mục khác / phát sinh


1. `+ Đà thép`, `+ Điều hòa...`, `+ Nội thất cabin` — thêm hạng mục có sẵn diễn giải. **Chỉ khi có hạng mục** thì đà thép / phát sinh mới vào biên bản lắp đặt tĩnh và các **biên bản kiểm tra**.
2. `+ Thêm hạng mục khác` — tự đặt tên, đơn vị, số lượng.

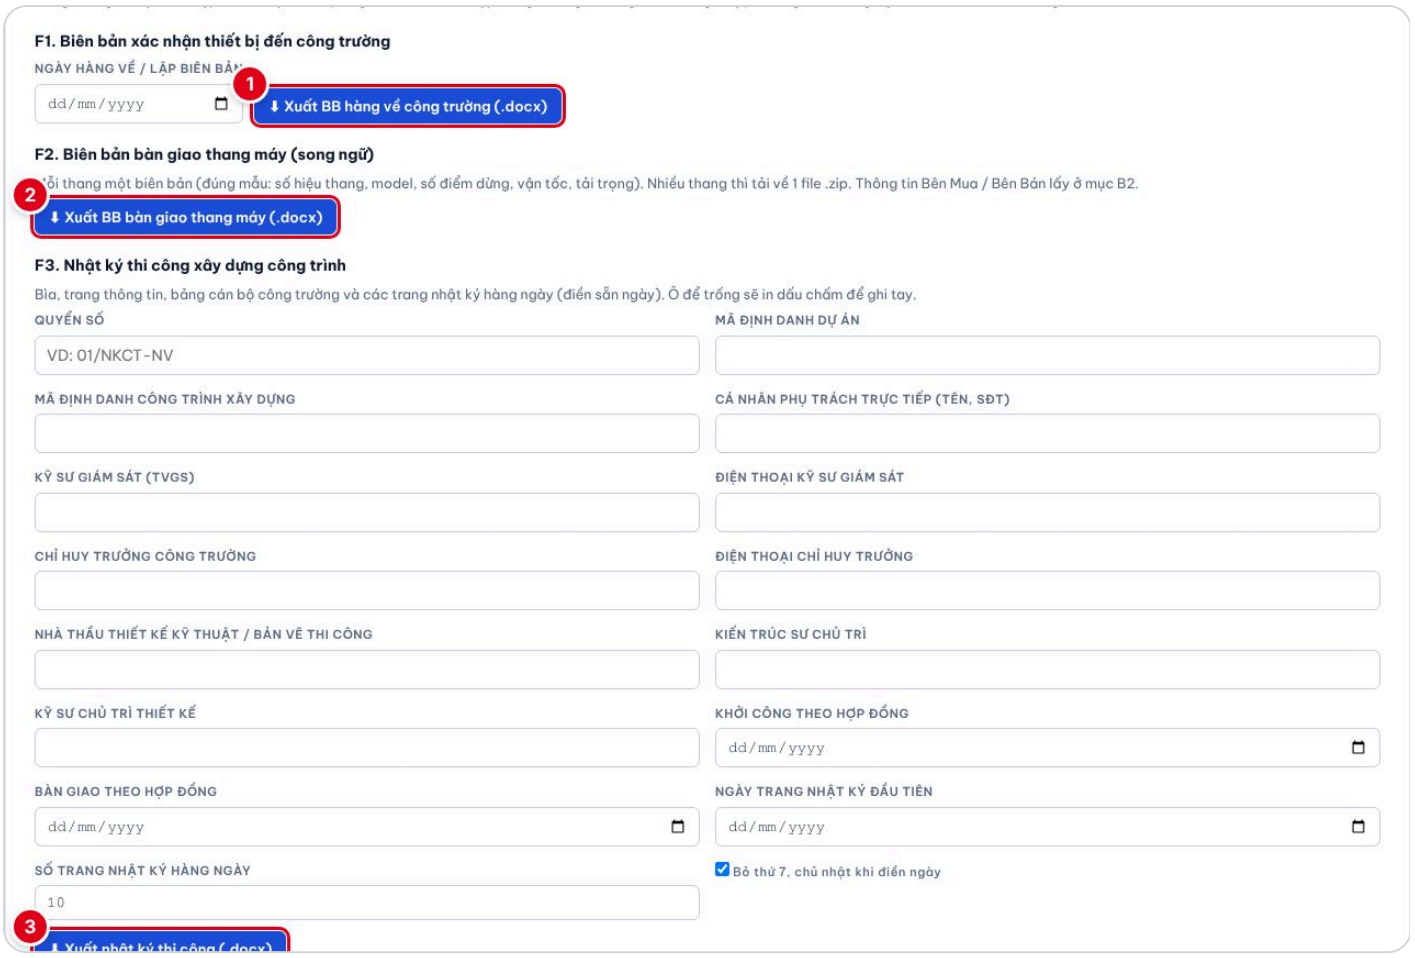

Mục F — Tài liệu bổ sung (xuất riêng từng file)

1. **Biên bản xác nhận thiết bị đến công trường** — lấy số HBL, Packing List, C/O, C/Q, số kiện ở mục C2.
2. **Biên bản bàn giao thang máy** (song ngữ) — mỗi thang một file; nhiều thang tải về file .zip.
3. **Nhật ký thi công** — bìa, trang thông tin, bảng cán bộ và số trang nhật ký hằng ngày (điền sẵn ngày).

Bước 4 — Xuất bộ hồ sơ

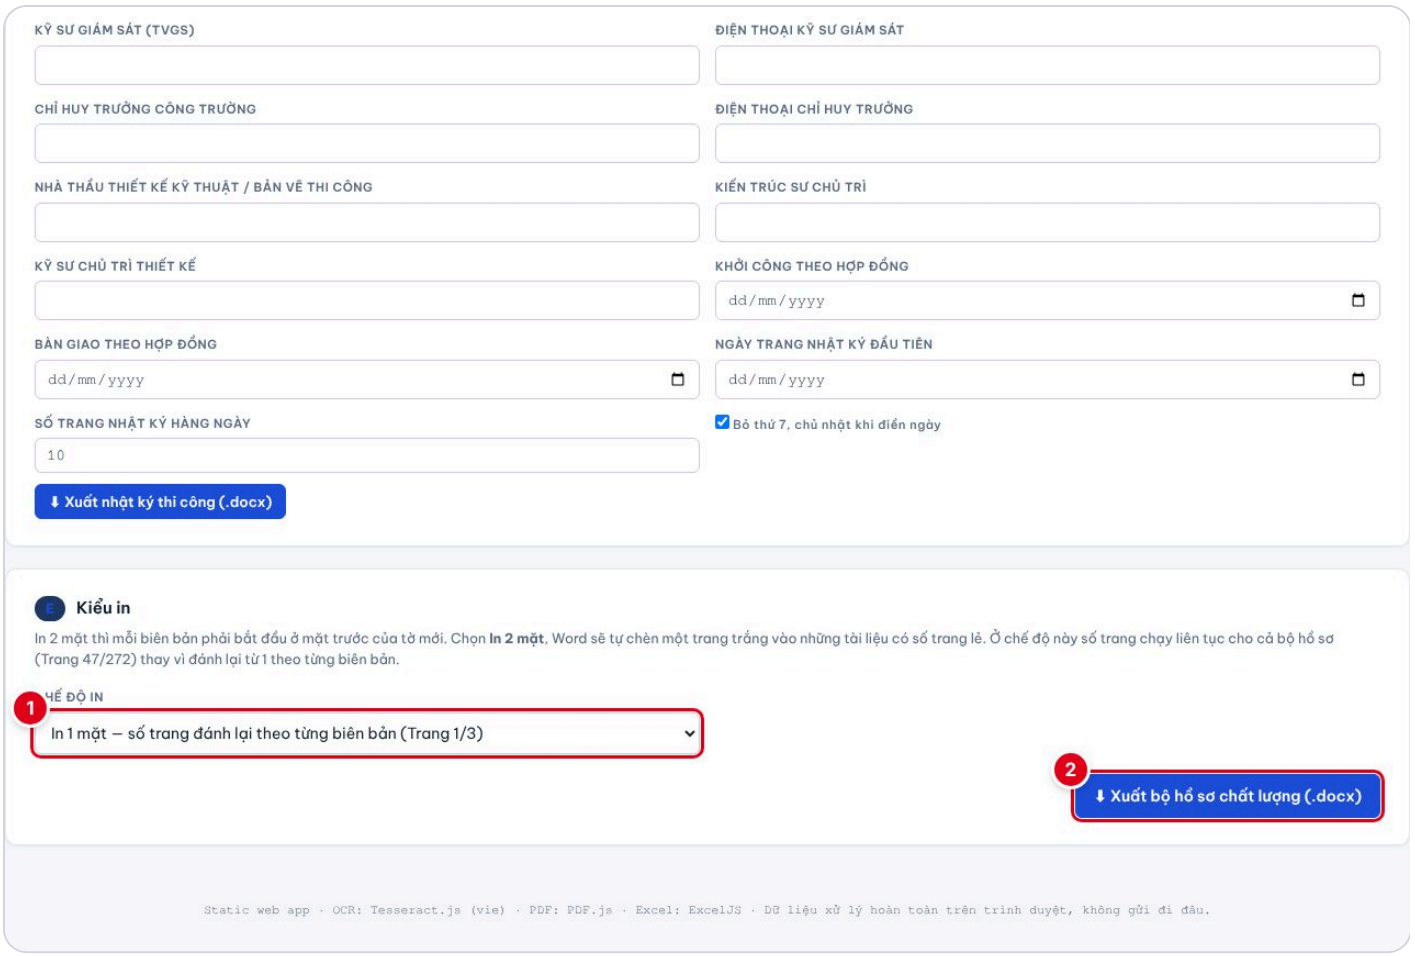


Mục E — Kiểu in và nút xuất

1. **Chế độ in**: 1 mặt (đánh số trang theo từng biên bản) hoặc 2 mặt (tự chèn trang trắng).
2. ⬇ Xuất bộ hồ sơ chất lượng (.docx) → mở bằng Word, kiểm tra rồi in.

> 💡 Dữ liệu hồ sơ nằm trên trình duyệt của bạn. Lần sau mở lại vẫn còn; đổi máy thì phải nhập lại (hoặc chọn dự án từ danh sách chung để điền nhanh).

3.5. Thống kê giờ công dự án

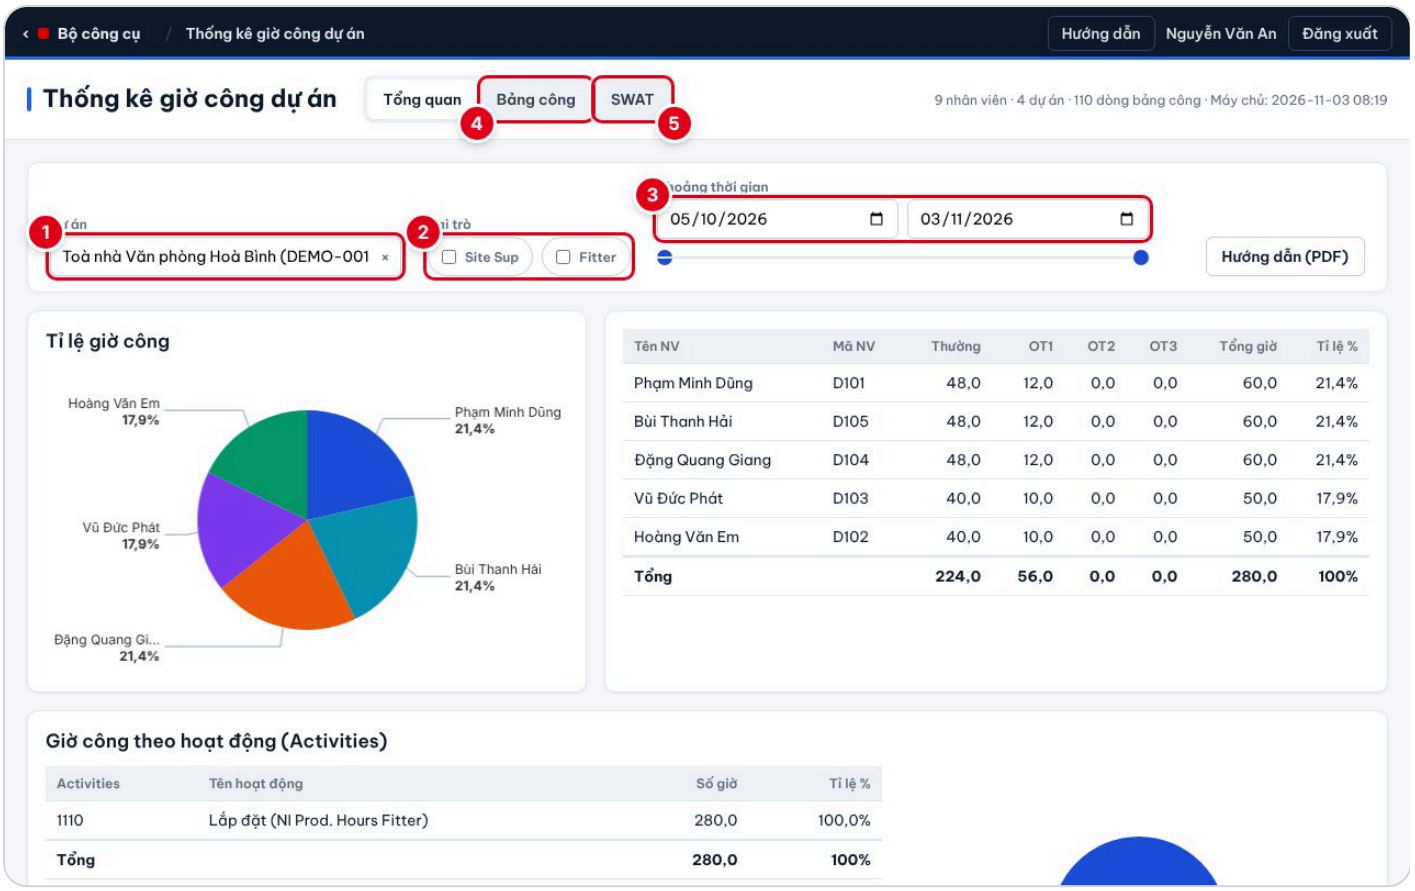

Tổng quan giờ công theo dự án


1. **Dự án** — gõ tên hoặc WBS để chọn.
2. Lọc theo **Site Sup / Fitter**.
3. **Khoảng ngày** — chọn từ ngày – đến ngày hoặc kéo thanh trượt.
4. Tab **Bảng công** — xem từng dòng giờ công (gồm cả Excel nạp hằng tháng và bảng công đã duyệt).
5. Tab **SWAT** — tính SWAT Hour, so sánh với giờ thực tế, xuất báo cáo.

Hướng dẫn chi tiết các biểu đồ, báo cáo PDF / Excel: Hướng dẫn Thống kê giờ công (PDF).


4. Quản lý dự án

Duyệt bảng công cấp 2, điều phối nhân sự, theo dõi lịch trình, đánh giá bám kế hoạch. Các thao tác của giám sát (mục 3) bạn cũng làm được.

4.1. Duyệt bảng công cấp 2

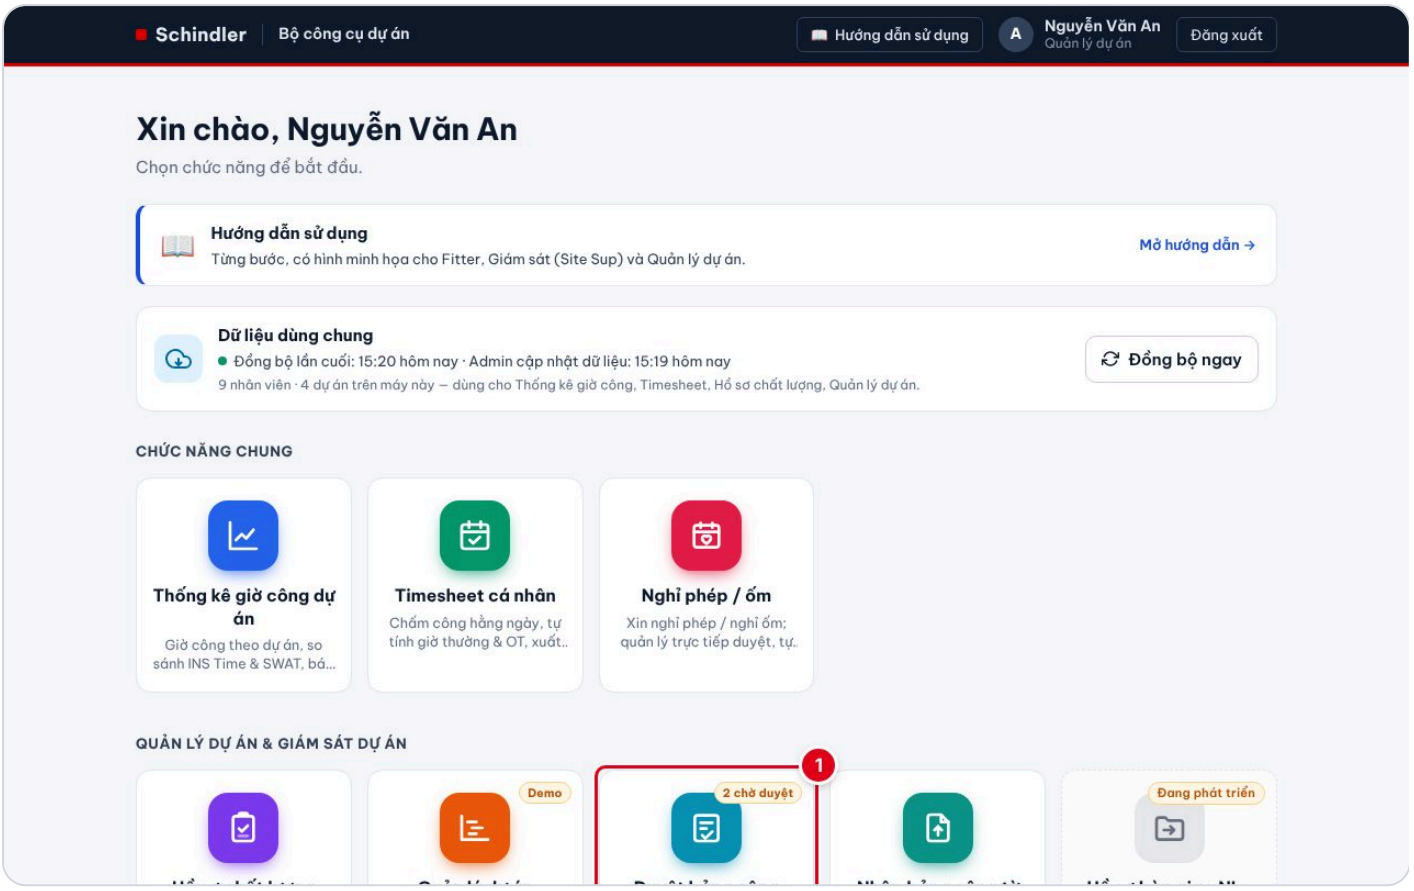

Nhãn “chờ duyệt” trên trang chủ

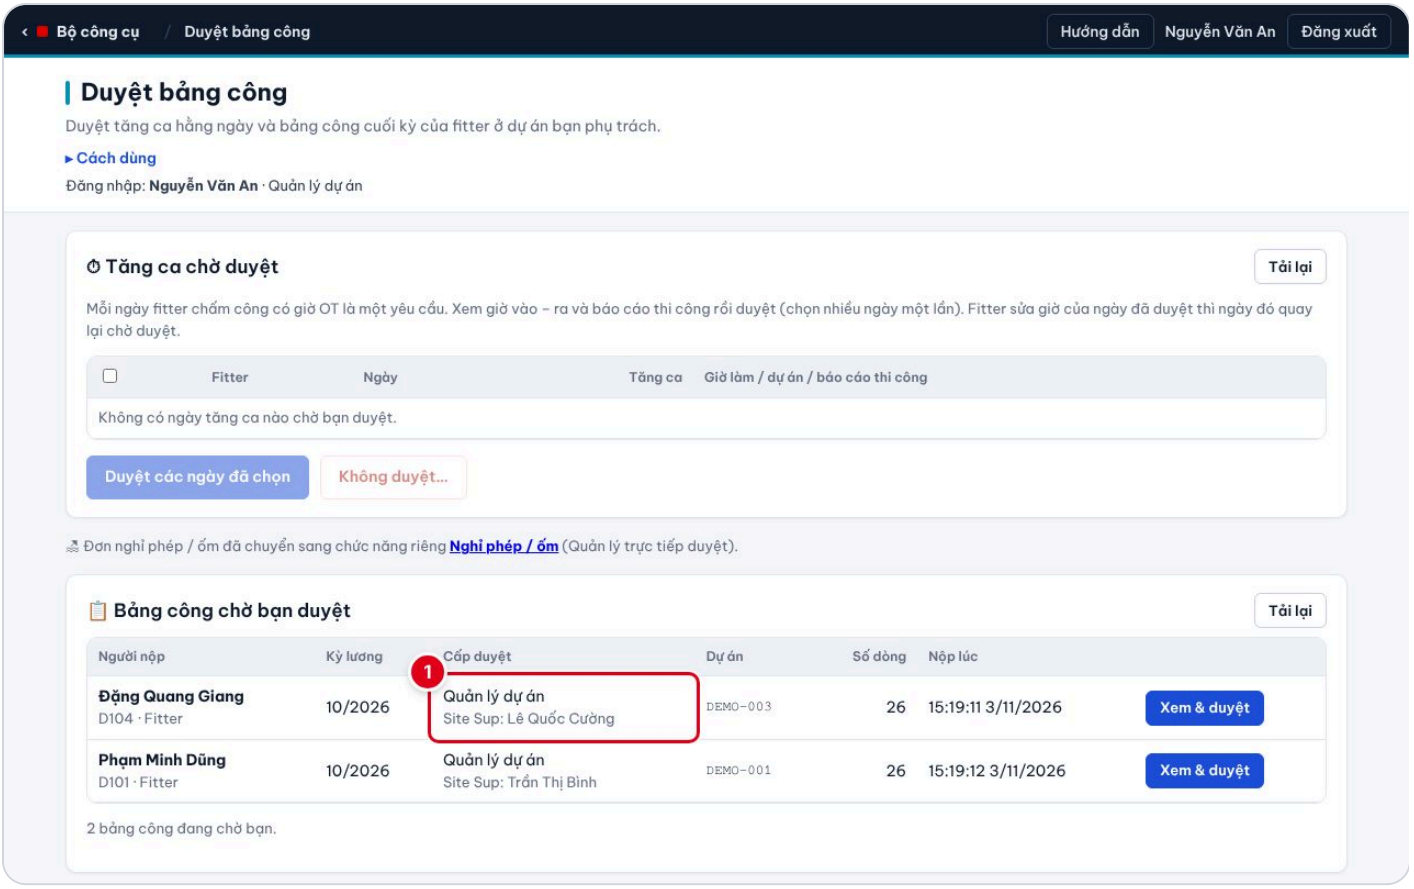


Bảng công Site Sup đã duyệt, chờ bạn

1 Cột **Cấp duyệt** ghi "Quản lý dự án" và tên **Site Sup đã duyệt** trước.

Mở chi tiết và duyệt / trả lại giống mục 3.2. Khi bạn bấm **Duyệt** (và mọi Quản lý dự án của các dự án trong bảng công đã duyệt), bảng công chuyển sang **Admin xử lý cuối**. Sau khi Admin bấm **Process**, trạng thái là Đã duyệt xong, **giờ công tự đẩy sang bảng Theo dõi giờ công** (Thống kê giờ công) và hệ thống gửi email **kèm Excel** bảng công + phụ cấp cho Fitter, Site Sup, Quản lý dự án.

4.2. Điều phối nhân sự (fitter × ngày)

Mở **Quản lý dự án → tab Điều phối nhân sự**. Dữ liệu lưu chung trên máy chủ: mọi Quản lý dự án / Site Sup cùng xem, tự lưu sau mỗi thay đổi.

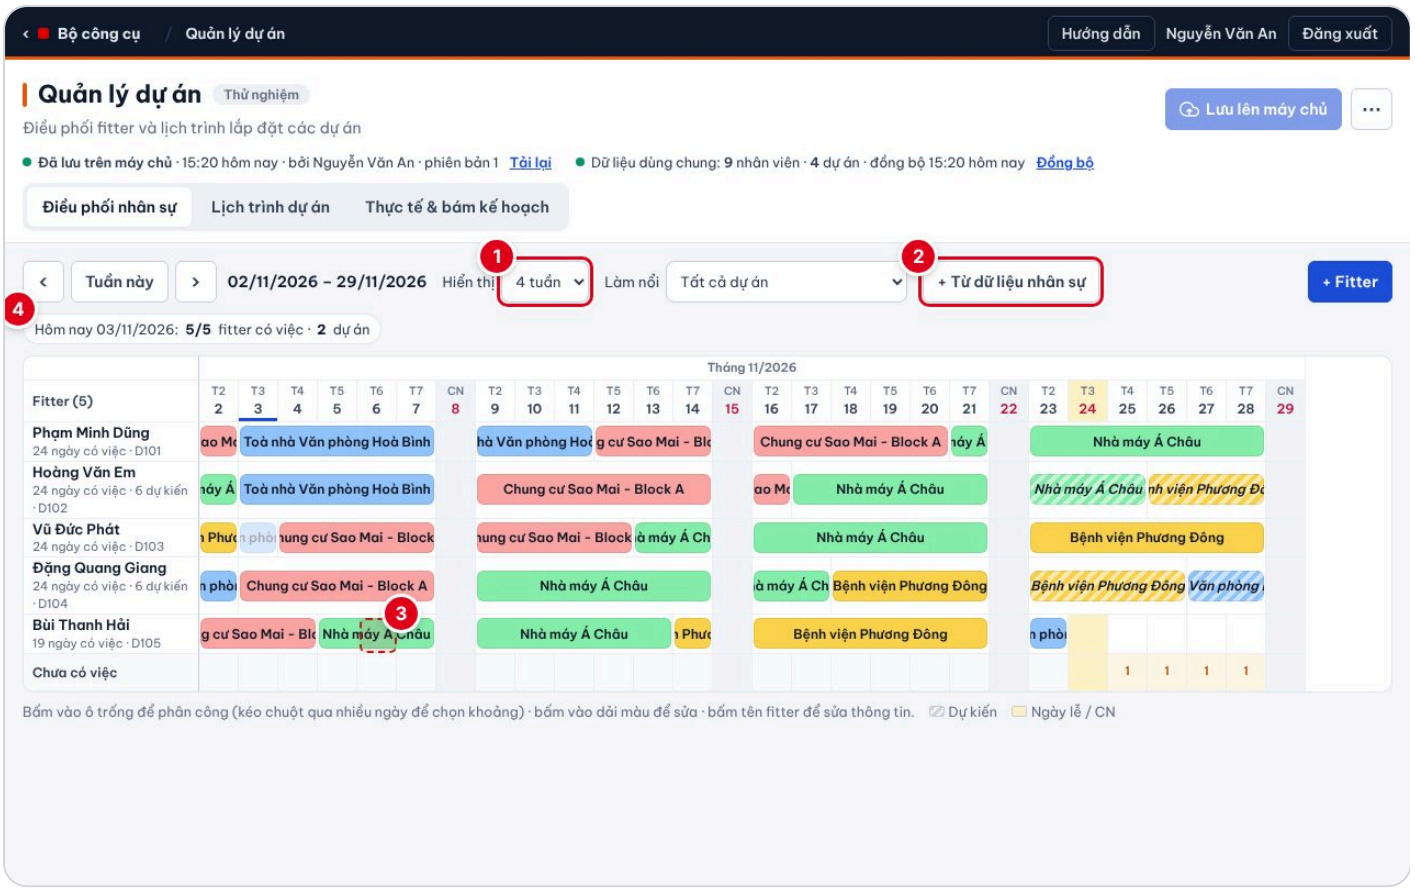


Lưới điều phối — đang kéo một dải phân công sang fitter khác

1. **Hiển thị 2 / 4 / 6 / 8 tuần**; nút ‹ **Tuần này** › để di chuyển.
2. `+ Từ dữ liệu nhân sự` — thêm fitter từ EE Data (có mã NV, cần cho mục 4.4).
3. **Kéo thả (máy tính)**: giữ chuột trên một dải màu rồi kéo sang fitter / ngày khác — khung nét đứt cho thấy chỗ sẽ thả (đỏ = đè lên lịch đã có). Kéo **mép trái / phải** của dải để rút ngắn / kéo dài.
4. **Hôm nay**: số fitter có việc và tên người đang rảnh.

1. **Phân công mới**: bấm ô trống (hoặc kéo chuột qua nhiều ô trống) → chọn dự án, từ – đến ngày, **Chính thức** hay **Dự kiến** (dải sọc) → Lưu.
2. **Sửa**: bấm (không kéo) vào dải màu → đổi dự án / ngày / fitter, hoặc **Bỏ trống**.
3. Mọi thay đổi có **Hoàn tác** trên thông báo hiện ra.


ℹ️ Nền vàng = ngày lễ, xám = Chủ nhật. Dòng cuối **Chưa có việc** đếm số fitter rảnh mỗi ngày làm việc.

4.3. Lịch trình dự án

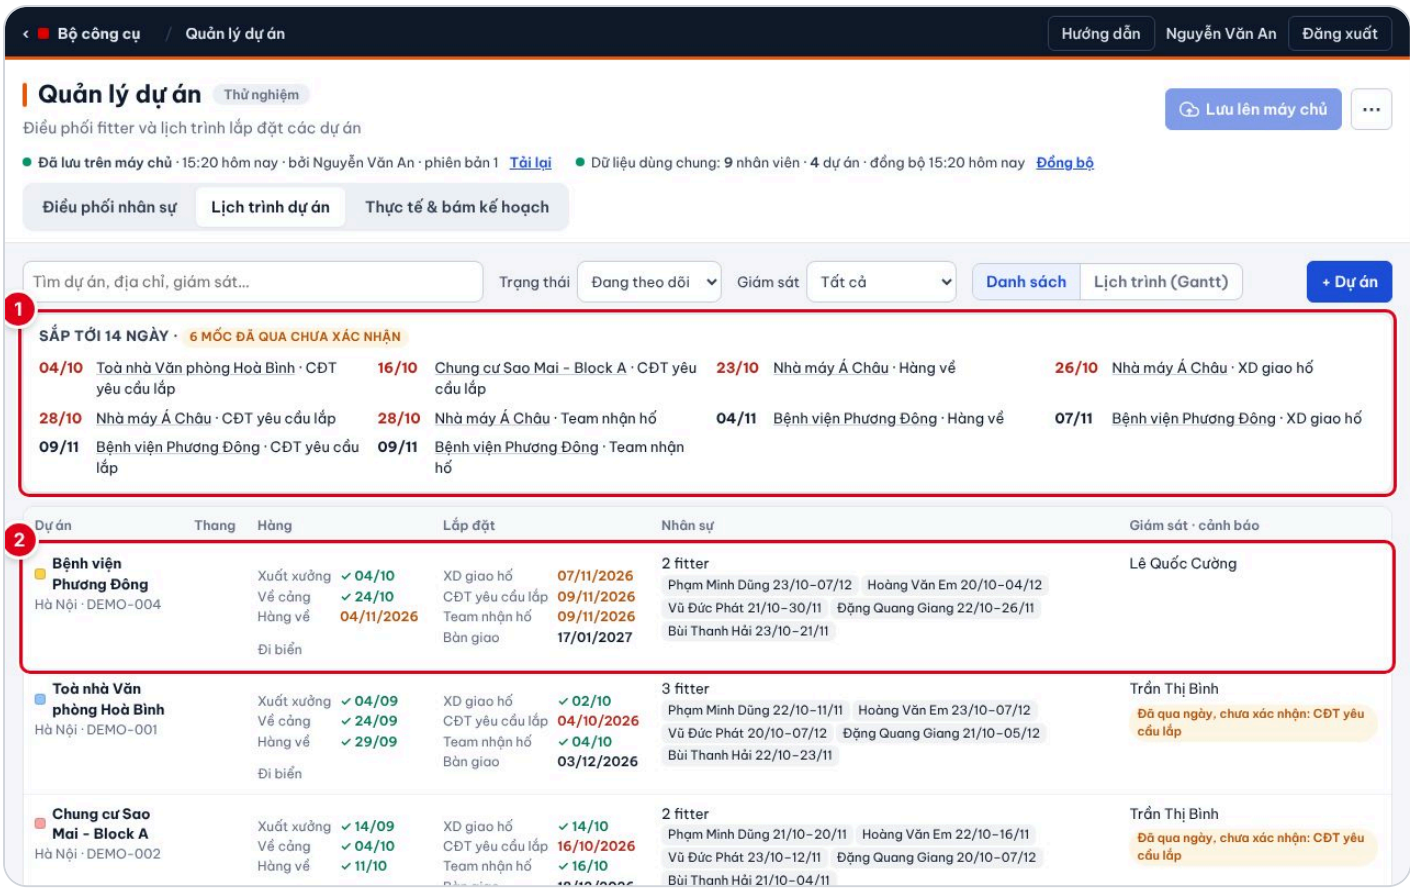

Dạng danh sách

1. **Sắp tới 14 ngày** — các mốc sắp đến và mốc **đã qua chưa xác nhận** (đỏ).
2. Mỗi dự án: thông số thang, mốc hàng (xuất xưởng, về cảng, hàng về), mốc lắp đặt (giao hố, CĐT yêu cầu, nhận hố, bàn giao), fitter đang phân công, giám sát và cảnh báo.

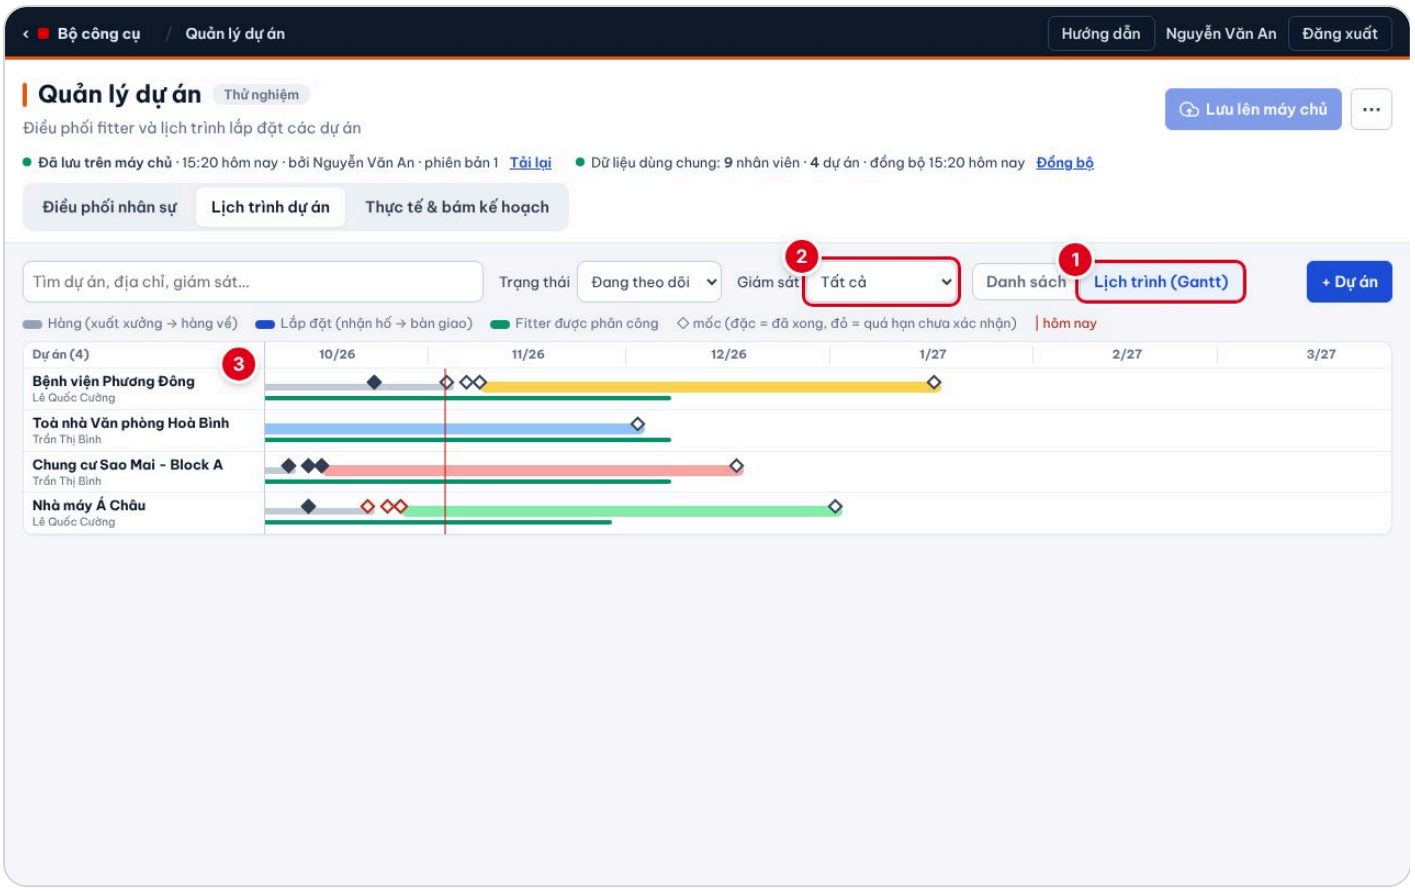


Dạng Gantt — xem nhanh toàn cảnh

1. **Danh sách / Lịch trình (Gantt)** — chuyển cách xem.
2. Lọc theo **Giám sát**, trạng thái, tìm theo tên.
3. Mỗi dòng một dự án: dải hàng, dải lắp đặt, gạch xanh fitter, các mốc ◇ (ký hiệu xem bảng ở mục 3.3).

> 💡 **Tự điền thông số thang:** khi dự án có **WBS** trùng với dự án chung, loại thang, số điểm dừng, tải trọng, hành trình, số lượng, giám sát được **tự điền vào ô còn trống**. Thêm dự án mới mà gõ tên giống dự án chung, app gợi ý "*Có phải dự án … ?*" — bấm để liên kết.


4.4. Thực tế & bám kế hoạch

So **kế hoạch điều phối** với **chấm công thực tế** (bảng Theo dõi giờ công) để biết fitter có làm đúng dự án như kế hoạch không và đánh giá chất lượng lên kế hoạch của giám sát.

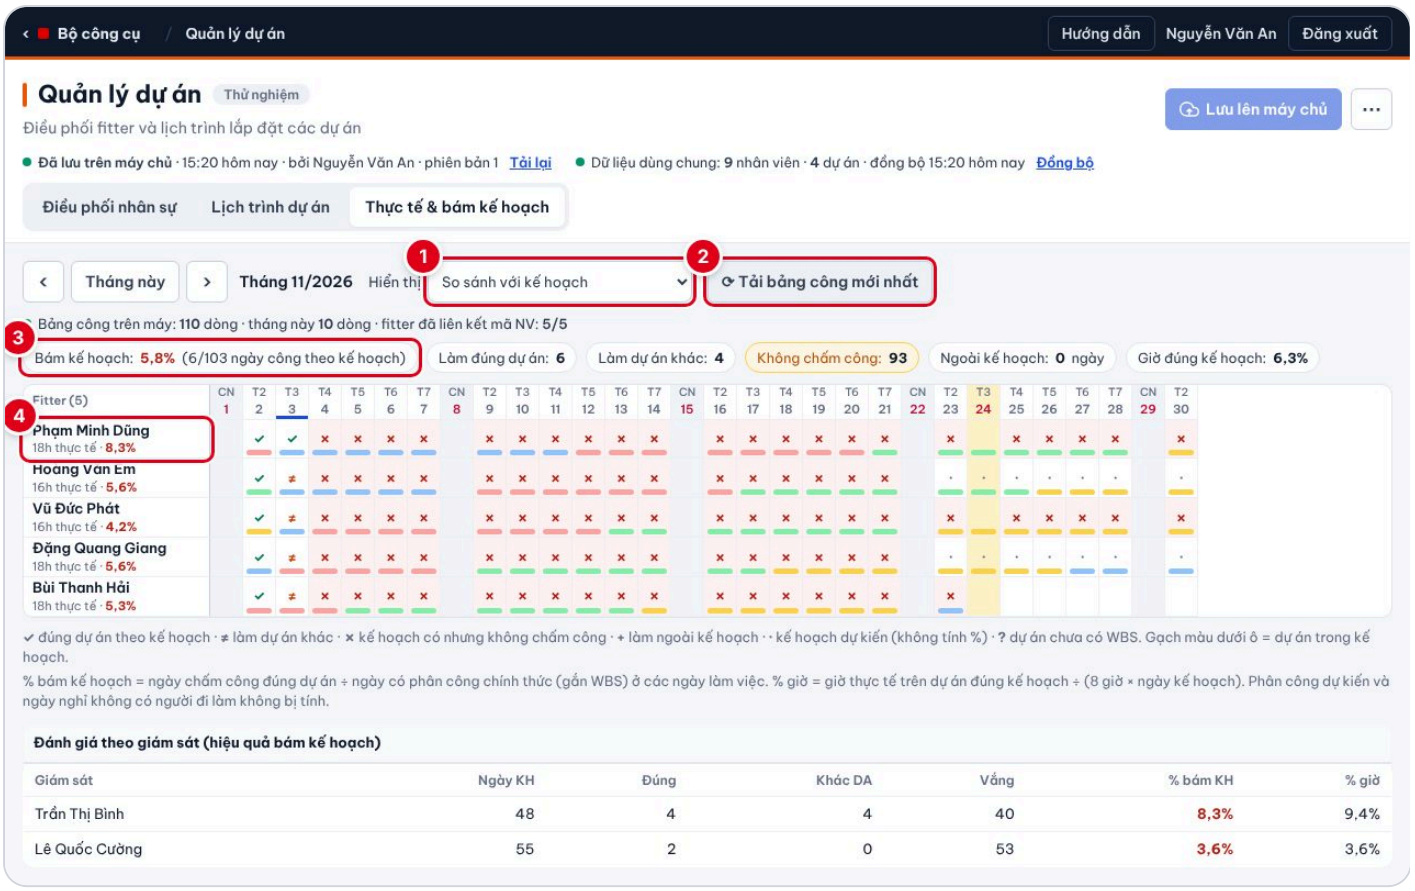

So sánh với kế hoạch (theo tháng)

1. **Hiển thị**: *So sánh với kế hoạch* hoặc *Gantt thực tế*.
2. ⟳ Tải bảng công mới nhất — lấy dữ liệu chấm công mới nhất từ máy chủ.
3. **% bám kế hoạch** = số ngày làm đúng dự án ÷ số ngày có phân công chính thức. Xanh ≥ 90%, vàng 70–90%, đỏ < 70%.
4. Mỗi fitter: giờ thực tế và % bám kế hoạch. Trong ô ngày: ✓ đúng dự án · ≠ làm dự án khác · × có kế hoạch nhưng không chấm công · + làm ngoài kế hoạch. Gạch màu dưới ô = dự án theo kế hoạch.



✓ đúng dự án theo kế hoạch · ≠ làm dự án khác · × kế hoạch có nhưng không chấm công · + làm ngoài kế hoạch · · kế hoạch dự kiến (không tính %) · ? dự án chưa có WBS. Gạch màu dưới ô = dự án trong kế hoạch.

% bám kế hoạch = ngày chấm công đúng dự án ÷ ngày có phân công chính thức (gắn WBS) ở các ngày làm việc. % giờ = giờ thực tế trên dự án đúng kế hoạch ÷ (8 giờ × ngày kế hoạch). Phân công dự kiến và ngày nghỉ không có người đi làm không bị tính.

Đánh giá theo giám sát (hiệu quả bám kế hoạch)

Giám sát	Ngày KH	Đúng	Khác DA	Vắng	% bám KH	% giờ
Trần Thị Bình	48	4	4	40	8,3%	9,4%
Lê Quốc Cường	55	2	0	53	3,6%	3,6%


Theo dự án

Dự án	Ngày KH	Đúng	Khác DA	Vắng	% bám KH	% giờ
Nhà máy Á Châu	36	1	0	35	2,8%	2,8%
Bệnh viện Phương Đông	19	1	0	18	5,3%	5,3%
Chung cư Sao Mai - Block A	32	2	2	28	6,3%	6,3%
Toà nhà Văn phòng Hoà Bình	16	2	2	12	12,5%	15,6%

Theo fitter

Fitter	Ngày KH	Đúng	Khác DA	Vắng	% bám KH	% giờ
Vũ Đức Phát	24	1	1	22	4,2%	4,2%
Bùi Thanh Hải	19	1	1	17	5,3%	5,3%
Hoàng Văn Em	18	1	1	16	5,6%	5,6%
Đặng Quang Giang	18	1	1	16	5,6%	6,9%
Phạm Minh Dũng	24	2	0	22	8,3%	9,4%

Bảng đánh giá theo **giám sát**, theo dự án, theo fitter

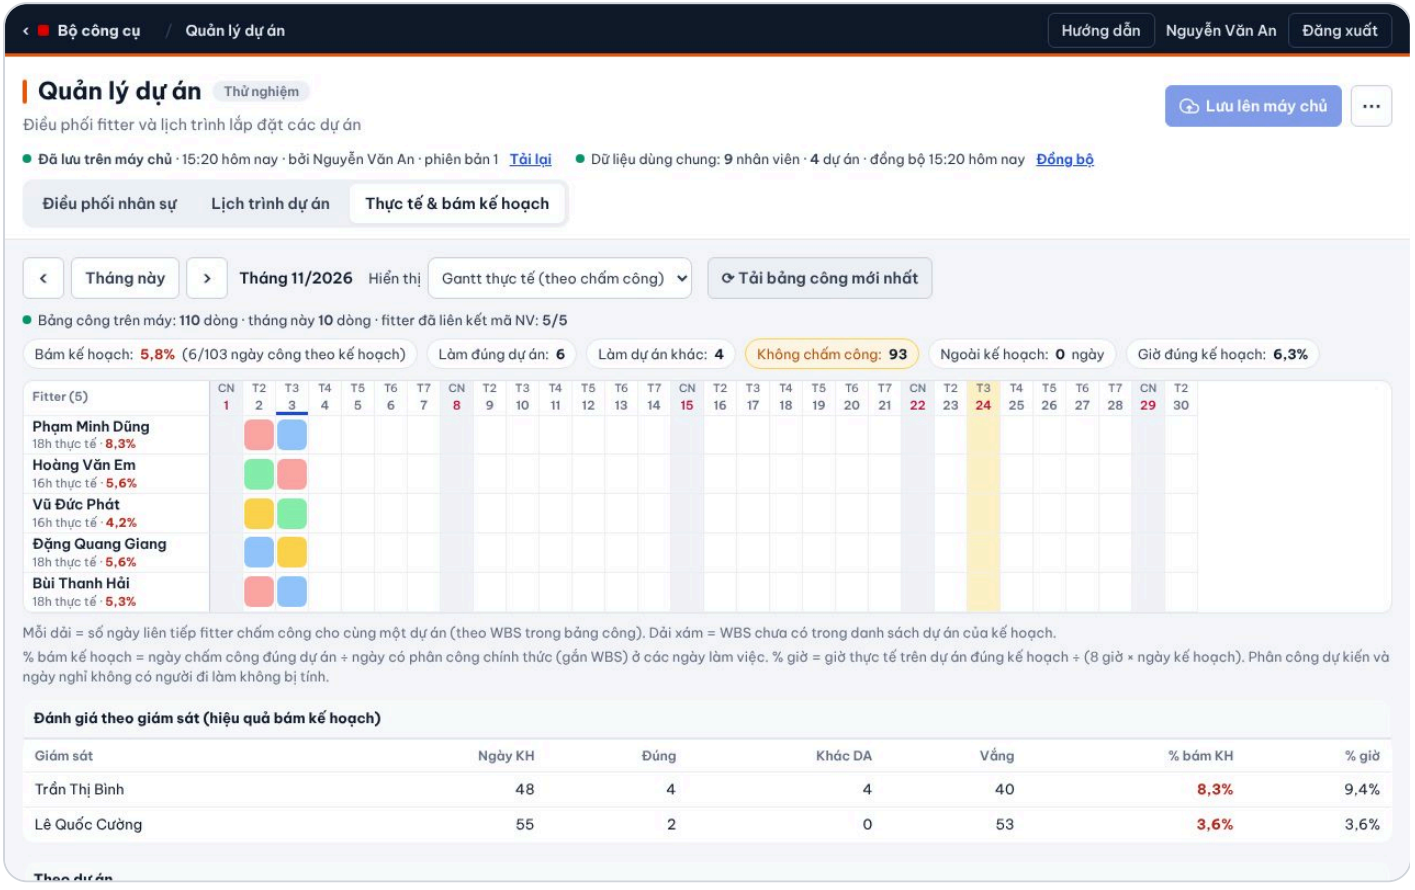

Mỗi dải = số ngày liên tiếp fitter chấm công cho cùng một dự án (theo WBS trong bảng công). Dải xám = WBS chưa có trong danh sách dự án của kế hoạch.

% bám kế hoạch = ngày chấm công đúng dự án ÷ ngày có phân công chính thức (gắn WBS) ở các ngày làm việc. % giờ = giờ thực tế trên dự án đúng kế hoạch ÷ (8 giờ × ngày kế hoạch). Phân công dự kiến và ngày nghỉ không có người đi làm không bị tính.

Đánh giá theo giám sát (hiệu quả bám kế hoạch)


Giám sát	Ngày KH	Đúng	Khác DA	Vắng	% bám KH	% giờ
Trần Thị Bình	48	4	4	40	8,3%	9,4%
Lê Quốc Cường	55	2	0	53	3,6%	3,6%

Theo dự án

Gantt thực tế: fitter thật sự làm dự án nào trong tháng

⚠️ Muốn đối chiếu được: fitter trong lưới phải **liên kết mã NV** (thêm bằng "+ Từ dữ liệu nhân sự" hoặc bấm tên fitter để liên kết) và dự án phải có **WBS**. Phân công **dự kiến** và ngày nghỉ không có người đi làm không bị tính.

4.5. Bảng tiến độ thi công

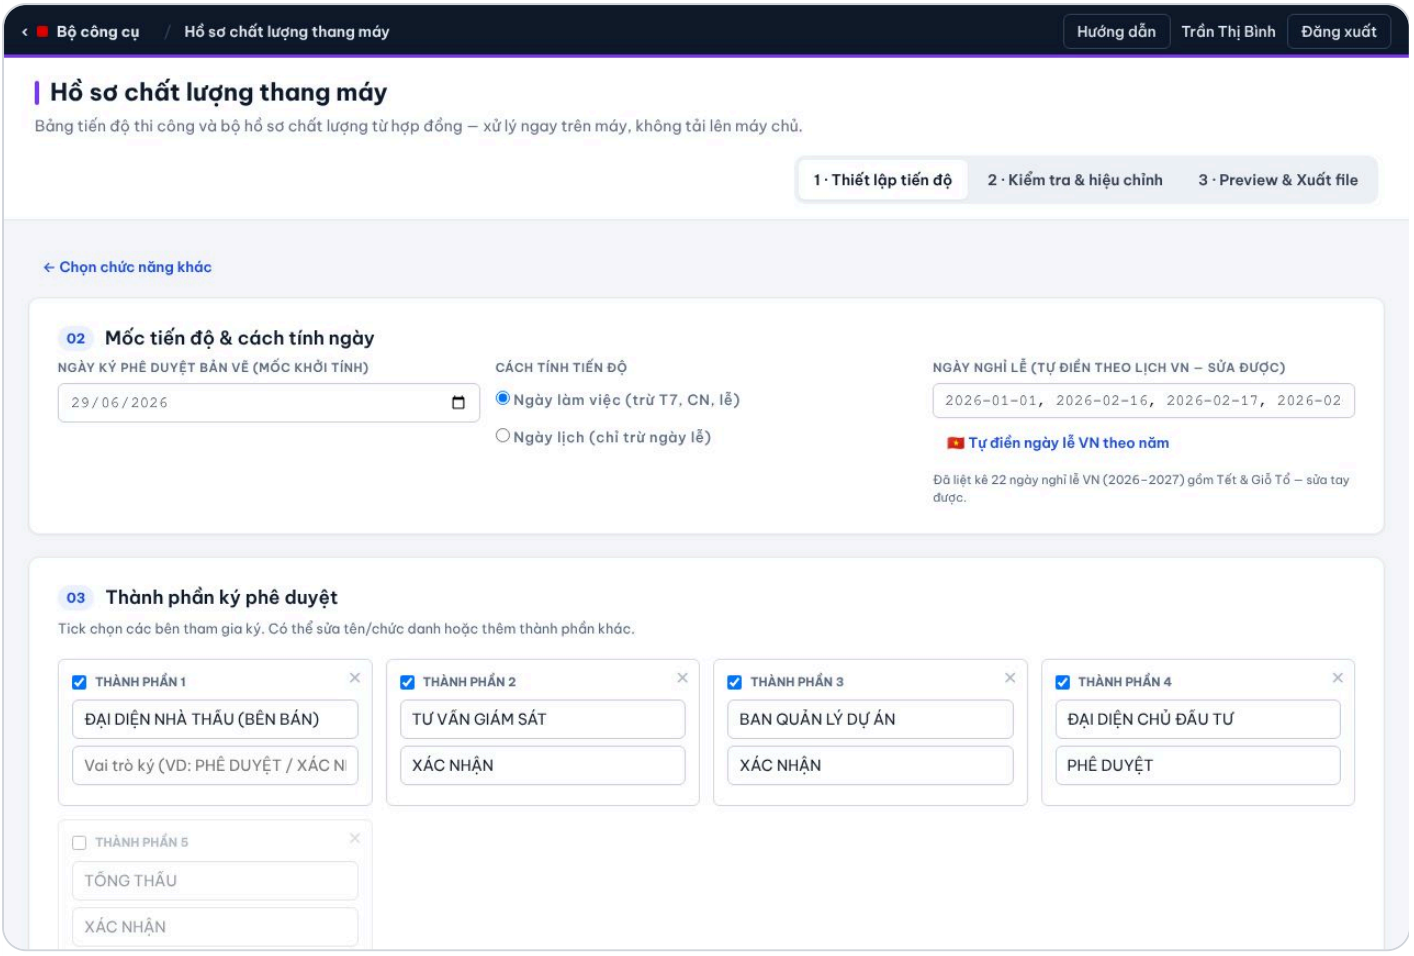


Hồ sơ chất lượng → **Lập bảng tiến độ thi công**

Nhập mốc ngày bắt đầu, chọn cách tính ngày (ngày làm việc / lịch), sửa danh sách bước và số ngày, các thành phần ký duyệt → **xuất Excel hoặc PDF khổ A3 ngang**. Ngày lễ Việt Nam được tự trừ. Từ bảng tiến độ có thể soạn **thư xác nhận hàng về** và nội dung email gửi khách hàng.


5. Quản trị viên

Chỉ tài khoản quản trị mới thấy thẻ “Quản trị”.

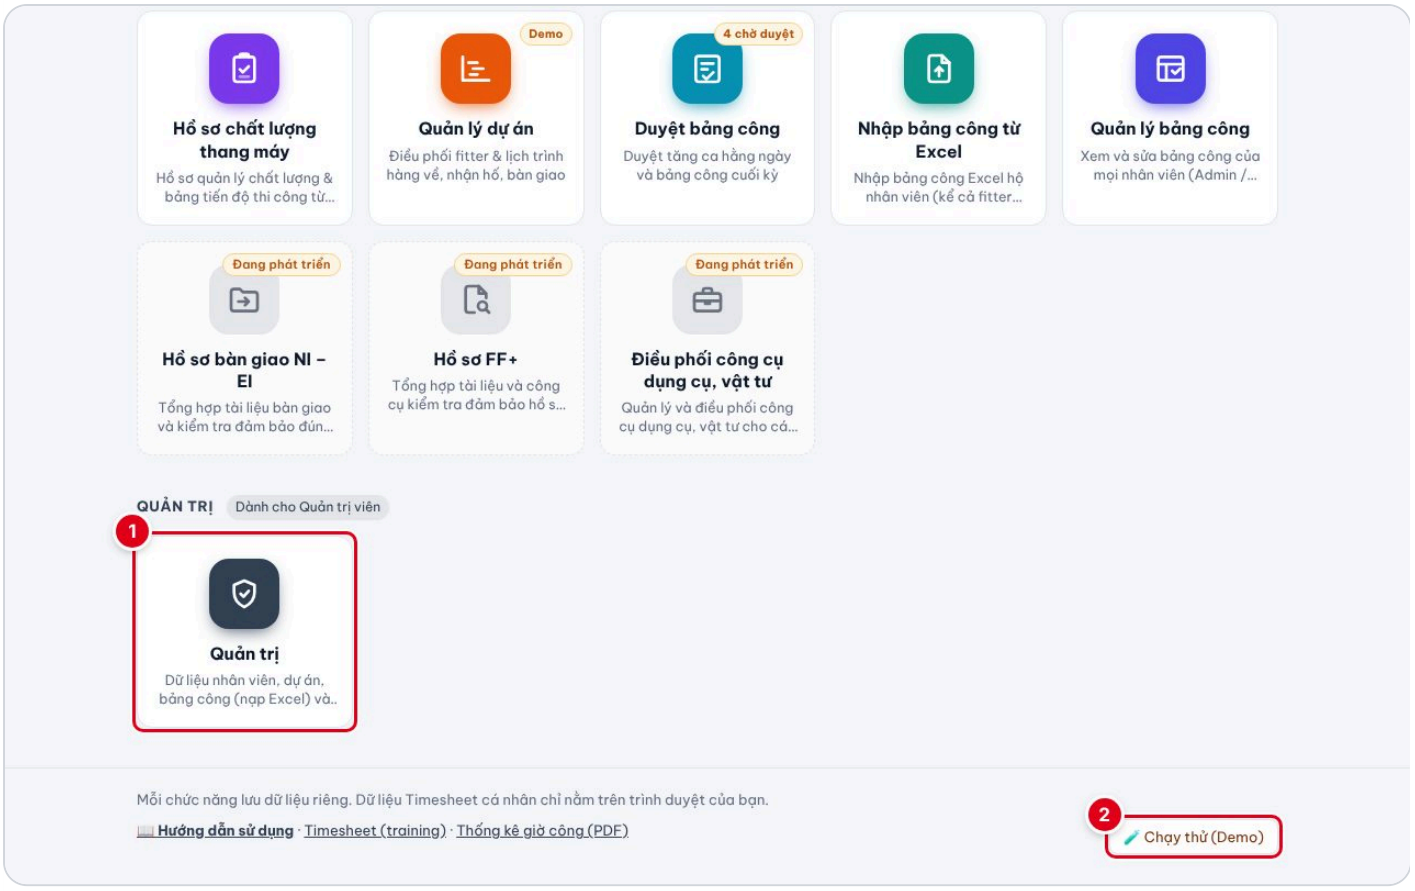

Trang chủ của quản trị viên

1. Thẻ **Quản trị** — dữ liệu nhân viên, dự án, bảng công, tài khoản.
2. **Chạy thử (Demo)** — dùng để hướng dẫn người mới mà không đụng dữ liệu thật.

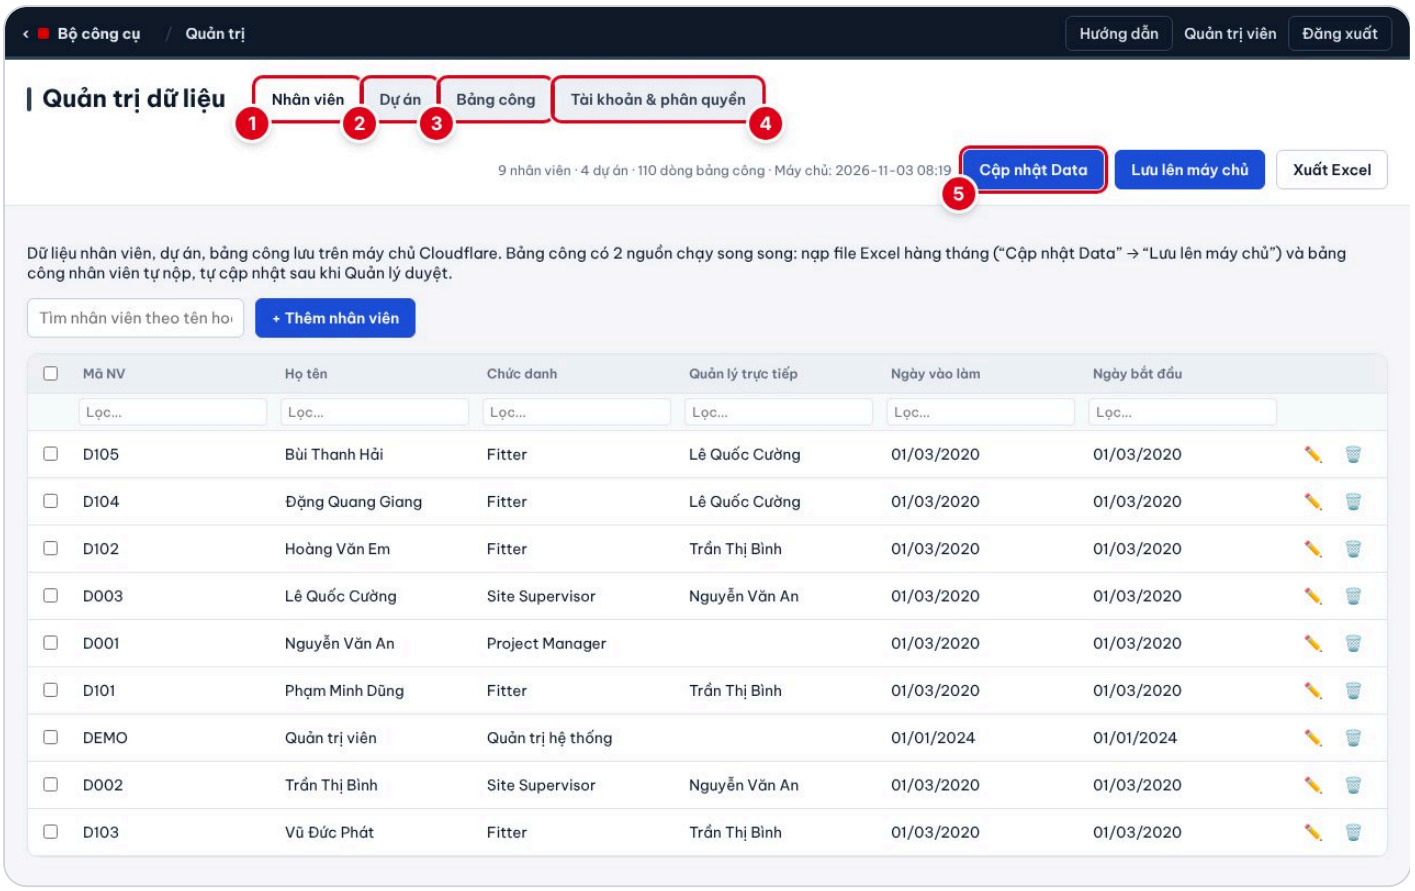

Trang Quản trị

1. **Nhân viên** — EE Data: thêm, sửa, xoá nhân viên; chức danh quyết định vai trò.
2. **Dự án** — danh sách dự án, WBS, thông số thang, Swat Target Hour.
3. **Bảng công** — bảng Theo dõi giờ công: tìm, lọc, tìm dòng trùng lặp, sửa / xoá.
4. **Tài khoản & phân quyền** — gắn email đăng nhập, chỉnh vai trò, khoá tài khoản, phân công Site Sup / Quản lý dự án cho dự án, nhật ký thay đổi, gửi email thử.
5. Cập nhật Data — nạp bảng công Excel hằng tháng.

5.0a. Duyệt yêu cầu đăng ký tài khoản

1. Người lạ đăng nhập bằng email **chưa có tài khoản** sẽ gửi **họ tên + mã NV** ở trang chủ. Mọi admin nhận email *"[Đăng ký] Họ tên (mã NV) xin cấp tài khoản"*; thẻ **Quản trị** ở trang chủ hiện *"N đăng ký mới"*.
2. Mở **Tài khoản & phân quyền** → mục **Yêu cầu đăng ký** (nút trong email mở thẳng mục này). Cột *Đối chiếu* cho biết mã NV có trong dữ liệu không, tên có khớp không, đã gắn email khác chưa.
3. Duyệt — email được gắn vào nhân viên đó (sửa ô mã NV nếu họ ghi sai) và người đăng ký nhận email báo. Mã NV chưa có trong dữ liệu: thêm nhân viên trước (Quản trị → Nhân viên) rồi duyệt.


4. Không duyệt… — nhập lý do; người đăng ký nhận email và thấy lý do ở trang chủ, có thể sửa rồi gửi lại.

5.0. Vai trò Admin dự án, xử lý cuối, sửa và xuất HR

1. **Admin dự án** (vai trò mới, chọn ở Tài khoản & phân quyền): xử lý bước cuối, xem / sửa mọi bảng công, nhập hộ, xuất HR, phân công Site Sup / Quản lý dự án — nhưng không quản lý tài khoản.
2. **Xử lý cuối:** ở Duyệt bảng công, bảng công đã qua Site Sup + Quản lý dự án đến **Admin** (hoạt động ngoài dự án do Admin duyệt) → **Process** → hệ thống gửi email kèm Excel (*TEN.xlsx*, *Pc Xang - TEN - thang M YYYY.xlsx*, *Pc Xe - …*). Thư lỗi: nút **Gửi lại thư kèm file**.
3. **Quản lý bảng công:** xem / sửa bảng công mọi nhân viên (bắt buộc ghi chú; người chủ thấy "Quản trị viên đã sửa"), nhập lịch sử từ Theo dõi giờ công, **Xuất cho HR** theo kỳ (zip: thư mục *Bảng công* và *Phụ cấp*, phụ cấp xe / xăng mỗi nhân viên một tab; không gửi email).
4. **Nộp hộ bảng công từ Excel:** giám sát, Quản lý dự án, Admin tải Excel lên, chỉnh theo đúng định dạng / quy tắc / dữ liệu dự án rồi nộp; chạy duyệt từ đầu, kể cả fitter không có tài khoản.

Chi tiết có hình: Hướng dẫn Timesheet — mục 9.

5.1. Nạp bảng công Excel hằng tháng

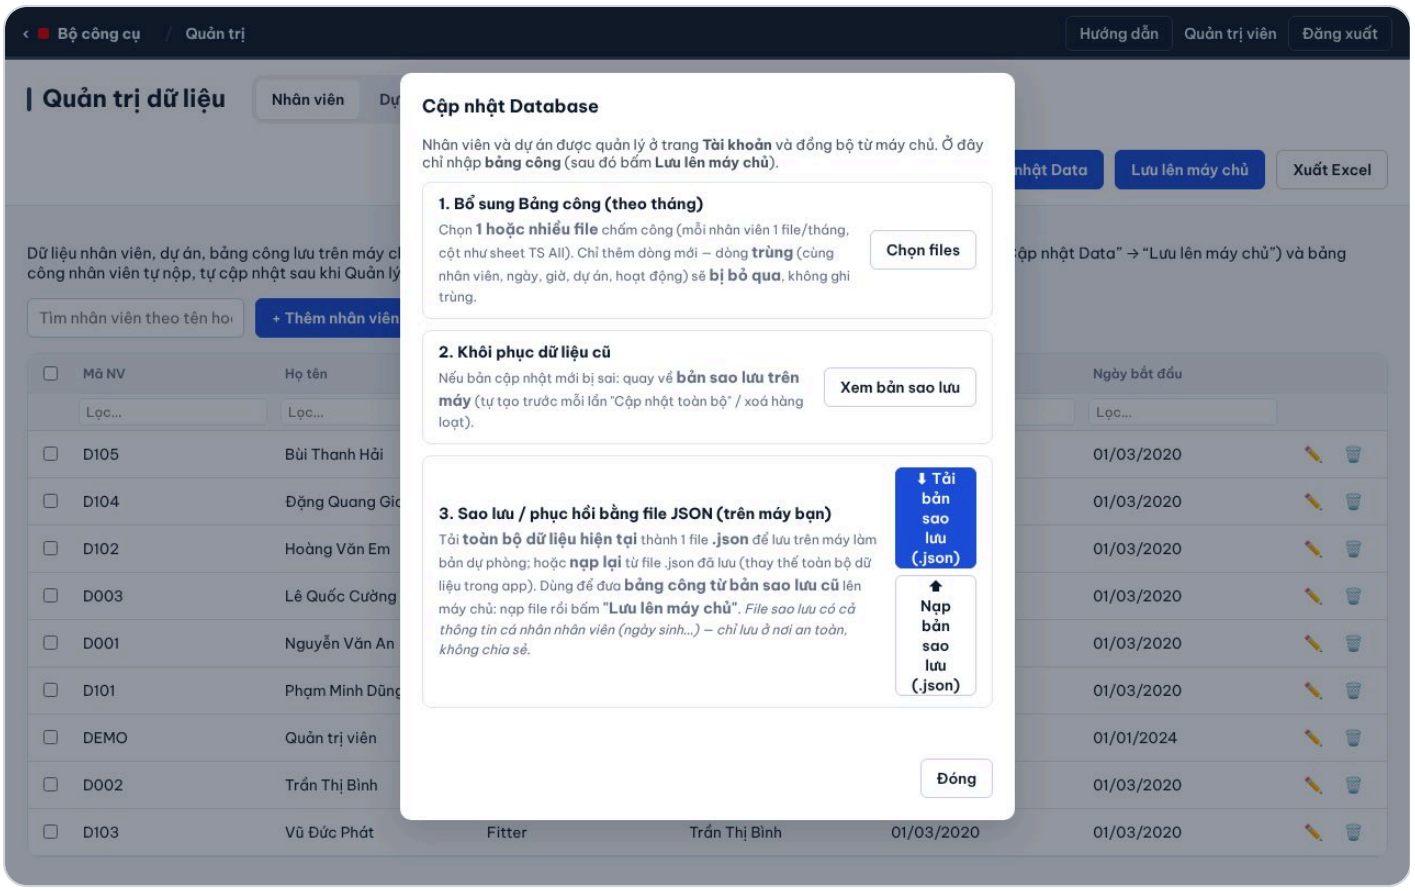


Cập nhật Data

1. Bấm **Cập nhật Data** → mục **1. Bổ sung Bảng công** → **Chọn files** (mỗi nhân viên 1 file / tháng, cột như sheet TS All). Dòng trùng tự bỏ qua.
2. Kiểm tra số dòng ở thanh trạng thái, rồi bấm **Lưu lên máy chủ**.

📌 **Hai nguồn bảng công chạy song song:** (1) file Excel quản trị nạp hằng tháng; (2) bảng công nhân viên tự chấm, **tự chuyển sang khi Admin xử lý (Process)**. Nạp lại Excel **không làm mất** các dòng đã duyệt (trừ ngày mà file Excel đã có dòng của người đó).

5.2. Tài khoản & phân quyền

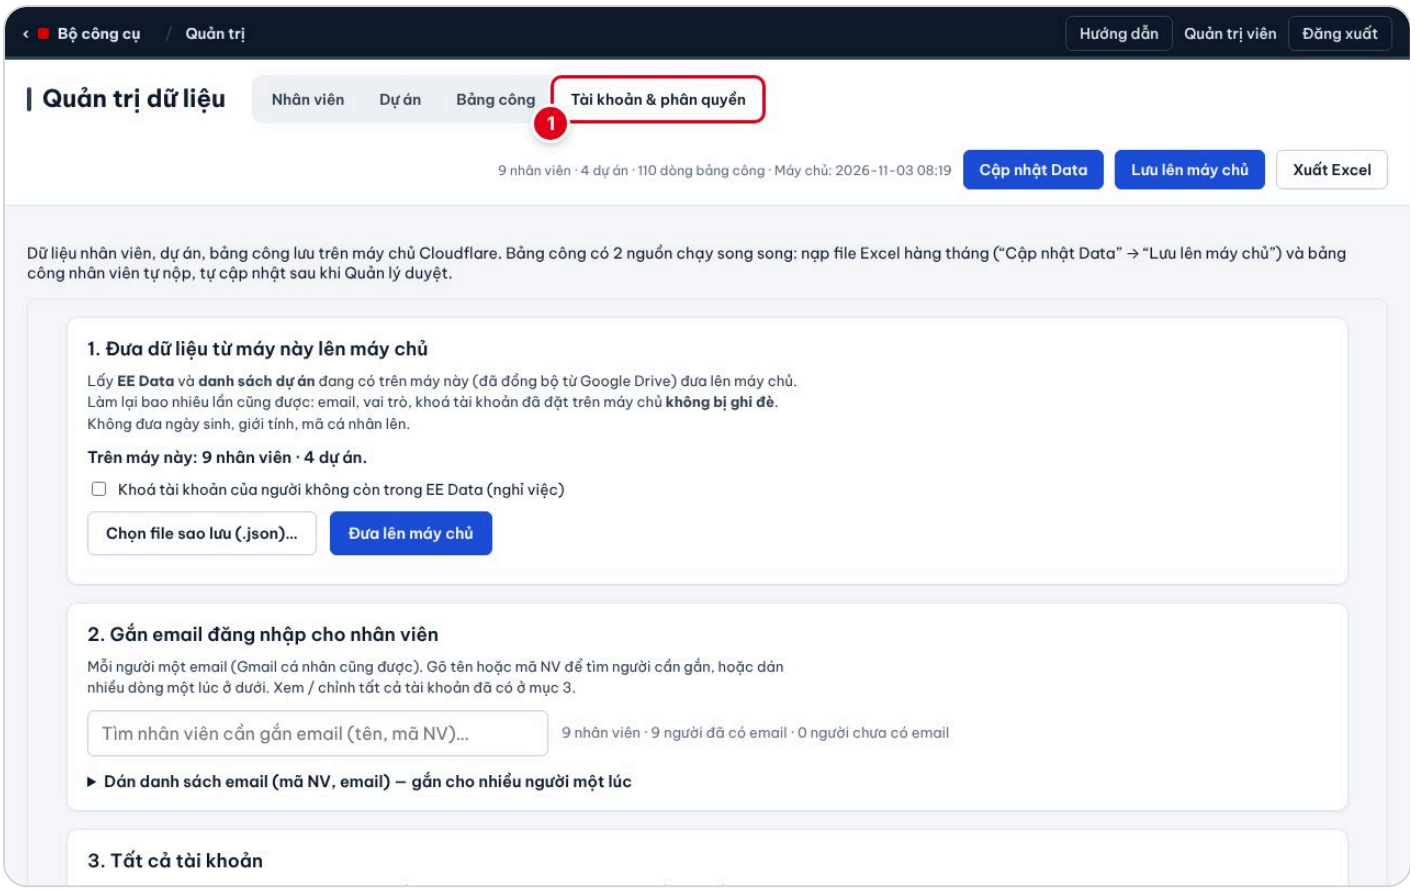

Tab Tài khoản & phân quyền

1. **Gắn email** cho từng nhân viên (gõ tên / mã NV để tìm), hoặc **dán danh sách** mã NV + email từ Excel.
2. **Vai trò**: vai trò chính mặc định theo chức danh, chỉnh tay được (Admin / Quản lý dự án / Site Sup / Nhân viên). **Kiêm nhiệm nhiều vai trò**: tick thêm ở dòng *Kiêm thêm* (Admin, Admin dự án, Quản lý dự án, Site Sup) — ví dụ một Quản lý dự án đồng thời là Admin và Admin dự án; người đó dùng được mọi chức năng của các vai trò đã tick. Không tự đổi vai trò của chính mình.
3. **Phân công dự án**: chọn Site Sup và Quản lý dự án cho từng dự án — quyết định ai duyệt bảng công của dự án đó.
4. Người nghỉ việc: **khoá tài khoản** (không xoá) để giữ lịch sử.

❓ 6. Hỏi đáp & xử lý sự cố

▶ **Mất sóng ở công trường có chấm công được không?**

▶ **Đổi điện thoại / dùng thêm máy tính thì sao?**

▶ **Không thấy dự án của mình khi chấm công?**

▶ **Nộp nhầm bảng công?**

▶ **OT chưa được duyệt có nộp bảng công được không?**

▶ **Báo “Cần làm dự án tỉnh trên 20 ngày” dù kỳ có 31 ngày?**

▶ **Người duyệt không có tài khoản app thì sao?**

▶ **Quá hạn ngày 12 chưa nộp?**

▶ **Không thấy chức năng Duyệt bảng công / Quản lý dự án?**

▶ **Không nhận được mã đăng nhập?**

▶ **Site Sup / Quản lý không nhận được bảng công tôi nộp?**

▶ **Chế độ Demo có làm mất dữ liệu thật không?**

▶ **Muốn in tài liệu hướng dẫn này?**

Bộ công cụ dự án — tài liệu hướng dẫn người dùng · cập nhật 10/2026 · ảnh minh hoạ dùng dữ liệu mẫu. Cần hỗ trợ: liên hệ quản trị viên của phòng.
